1-1-1. 투입인력 특장점

제안사는 1997년 나라장터의 모태인 조달EDI시스템 구축부터 26년간 나라장터 구축, 운영, 고도화, 차세대 나라장터 ISMP 컨설팅 및 9개국 수출사업에 참여한 이 분야 **최다 경험 전문가를** PM으로 투입하고 각 분야에 검증된 **나라장터 사업 전문인력**을 투입하여 성공적인 수행을 보장합니다.

검증된 인력으로 사업성공을 보장하는 수행조직 구성

나라장터 사업 26년 경험 전문 PM을 중심으로

안정적 사업수행 및 성과 달성 보장

선행사업의 핵심인력 투입 | 유사사업 경험자 투입 | 각 분야별 검증된 인력 투입

핵심분야별 검증된 전문인력 투입

핵심분야	투입인력	주요경력	특장점/기대효과
총괄PM	 송종인	• 이집트, 이라크, 요르단, 튀니지 나라장터 구축 PM • 르완다, 몽골, 베트남 나라장터 구축 개발총괄 • 카메룬, 코스타리카 나라장터 구축 PL • 나라장터 구축, 운영, 고도화, ISMP	• 사업특성 이해 • 수원국 리더쉽 리딩 • 검증된 사업수행 방법론 적용 • 舊나라장터와 차세대 나라장터 경험을 바탕으로 맞춤형 현지화 전략 수립 • 운영성과 달성 노하우
컨설팅총괄 PL	 김영구	• 이집트, 이라크, 르완다 나라장터 구축 컨설팅 • 콜롬비아, 알제리 공공조달 현대화 사업 기획조사	• 수원국에 적합한 전자조달 모델 설계 • 국가별 공공조달 현대화 및 고도화 마스터플랜 수립 • 시스템 운영방안 및 역량강화 전략 수립
개발총괄 PL	 배홍길	• 이집트 나라장터 구축 PL • 나라장터 운영위탁 PL	• 나라장터 핵심 기능에 대한 운영 및 현지화 노하우 • 경험에 기반한 전자조달 운영지원 및 안정화
기자재총괄 PL	 최정원	• 키르기스스탄 국가 에너지시스템 개선을 위한 중앙집중 AMI 구축 • 차세대 나라장터 인프라 설계 및 구축 • 요르단 나라장터 구축 PL	• 키르기스스탄 사업 경험 활용 • 나라장터 인프라 구축 경험 및 노하우 적용 • 키르기스스탄 환경에 적합한 시스템 아키텍처 수립

1. 투입인력 현황 및 운용계획 ▶ 1-1. 투입인력 현황

1-1-2. 핵심투입 인력 – 총괄 PM

제안사는 1997년부터 현재까지 26년간 국내외 나라장터 구축, 운영.유지보수, 고도화, 차세대 ISMP 컨설팅 및 해외수출 사업을 수행한 이 분야 최고 전문가를 총괄PM으로 투입하여 축적된 경험과 노하우를 기반으로 안정적인 사업수행과 운영성과를 달성하겠습니다.

핵심투입인력 소개 – 총괄PM

26년 나라장터 사업경험 보유 전문가



송종인 PM

경력

- ㈜한국무역정보통신 소속(2014.03 입사, 직장경력 : 28년 4개월)
- 학력: 학사(성균관대학교 통계학)
- 원활한 영어 의사소통 가능(보고서 작성, 업무회의, 발표, 강의 등)
- 튀니지, 요르단, 이라크, 이집트 나라장터 구축사업 PM
- 2009년부터, 베트남, 코스타리카, 몽골, 르완다, 카메룬 나라장터 구축사업 수행
- 요르단, 알제리, 코스타리카, 세르비아, 르완다 전자조달 F/S 수행
- 1997년부터 2008년까지 조달청 전자조달 관련 사업 수행

◎ 주요 사업 수행경험

순번	구분	사업명	수행업무	투입기간	발주처
1	해외	이라크 쿠르드지방정부 공공조달 현대화 사업	PM	2019.12 ~ 2022.12	KOICA
2	해외	카메룬 전자조달 시스템 구축 2차	PL	2022.11 ~ 2022.05	KOICA
3	국내	차세대 국가종합전자조달시스템(나라장터) 구축전략 및 이행방안 수립(ISMP)	컨설팅	2020.06 ~ 2020.12	조달청
4	해외	요르단 전자조달시스템 구축사업 시스템 개발 및 기자재 공급(PC)	PM	2015.12 ~ 2017.12	KOICA
5	해외	르완다 전자조달 시스템 구축	개발총괄	2015.05 ~ 2015.11	르완다재무부
6	국내	2015년 나라장터 운영위탁 사업	PM	2015.03 ~ 2015.05	조달청
7	해외	튀니지 전자조달 시스템 시범구축 PMC 용역	PM	2011.11 ~ 2013.12	KOICA
8	해외	알제리, 요르단 전자조달분야 F/S 컨설팅	컨설팅	2012.05 ~ 2012.12	NIPA
9	해외	몽골 전자조달 시스템 구축	개발총괄	2010.09 ~ 2011.10	KOICA
10	해외	세르비아 전자조달분야 F/S 컨설팅	PM	2010.06 ~2010.09	NIPA
11	해외	코스타리카 전자조달 시스템 구축	PL	2009.10 ~ 2010.07	코스타리카 통신공사
12	해외	베트남 정부전자조달 파일럿 시스템 구축 PMC 용역	개발총괄	2008.11 ~ 2009.09	KOICA
13	해외	코스타리카 전자조달분야 FS 컨설팅	PM	2008.07 ~ 2008.11	KIPA
14	국내	휴대폰을 이용한 나라장터 입찰서비스 구축	PM	2008.04 ~ 2008.09	조달청
15	국내	나라장터 구축 및 운영	개발,PL	2002.03 ~ 2006.04	조달청

1-1-3. 핵심투입 인력 – 컨설팅 총괄 PL

제안사는 해외 공공분야 컨설팅과 나라장터 해외 구축 마스터플랜 수립 경험을 보유한 전문가를 컨설팅 분야 PL로 투입하여 키르기스스탄 환경에 적합한 공공전자조달 시스템 모델을 설계하고 안정적인 운영방안 및 역량강화 방안을 수립하겠습니다.

핵심투입인력 소개 – 컨설팅 총괄 PL

해외 공공분야 컨설팅 전문가



김영구 PL

경력

- 학력: 학사(순천향대학교 전산학)
- 원활한 영어 의사소통 가능(보고서 작성, 업무회의, 발표, 강의 등)
- 르완다, 이라크, 이집트 나라장터 구축사업 BPR/ISP 및 마스터플랜 수립
- 이라크, 알제리, 콜롬비아, 이집트 나라장터 구축사업 예비조사/기획조사
- 르완다, 캄보디아 공공분야 시스템 구축 및 컨설팅 사업 PM

◎ 주요 사업 수행경험

순번	구분	사업명	수행업무	투입기간	발주처
1	해외	이집트 수출입청 위험기반 검사 및 추적시스템 구축사업 타당성 조사	조사총괄	2024.01 ~ 2025.02	KOICA
2	해외	에티오피아 ICT기반의 양질의 일자리 양성을 위한 역량강화사업	컨설팅	2023.06 ~	KOICA
3	해외	베트남 한베 ICT대학교 교육역량강화 지원사업	컨설팅	2023.06 ~	KOICA
4	해외	이집트 정부서비스청 전자조달시스템 개선사업	컨설팅	2022.09 ~ 2024.11	KOICA
5	해외	스리랑카 고용정보서비스 ISP	총괄PM	2015.05 ~ 2015.11	르완다재무부
6	국내	경찰청 신원업무시스템의 안정적 정착 및 운영을 위한 변화관리	총괄PM	2022.05 ~ 2023.09	경철청
7	해외	캄보디아 고용정보시스템 전산망 구축	총괄PM	2018.12 ~ 2021.12	고용노동부
8	해외	이라크 쿠르드지방정부 공공조달 현대화 사업 PMC용역	컨설팅	2019.01 ~ 2019.06	KOICA
9	해외	이라크 쿠르드지방정부 공공조달 현대화 사업 기획조사	조사총괄	2018.03	KOICA
10	해외	르완다 행정망 구축 BPR/ISP	총괄PM	2018.03 ~2018.09	르완다개발청
11	해외	이라크 쿠르드지방정부 공공조달 현대화 사업 예비조사	조사총괄	2017.03	KOICA
12	해외	베트남 정부전자조달 파일럿 시스템 구축 PMC 용역	개발총괄	2008.11 ~ 2009.09	KOICA
13	해외	카메룬 전자정부 마스터 플랜 수립	컨설팅	2016 ~ 2017	KOICA
14	국내	알제리 재무부 공공조달 현대화 사업 기획조사	조사총괄	2017.02	KOICA
15	해외	르완다 정부 전자조딜 시스템 구축 BPR/ISP	컨설팅	2015.06 ~ 2015.09	르완다재무부

1-1-4. 핵심투입 인력 – 개발 총괄 PL

제안사는 나라장터 운영경험과 이집트 나라장터 구축 경험을 보유한 시스템 개발전문가를 투입하여 키르기스스탄 공공조달 업무를 명확하게 분석하고 나라장터의 특장점을 적용한 맞춤형 공공전자조달 시스템을 구현하겠습니다.

핵심투입인력 소개 – 개발 총괄 PL

나라장터 운영 및 수출 전문가



배홍길 PL

경력

- 학력: 석사(한양글로벌전문경영대학원 전략프로젝트경영)
- 정보처리기사(2004.06)
- 나라장터 운영 PL 및 사업관리
- 이집트 나라장터 시스템 구축 PL

◎ 주요 사업 수행경험

순번	구분	사업명	수행업무	투입기간	발주처
1	해외	이집트 정부서비스청 전자조달 시스템 개선사업	PL	2022.12 ~ 2025.06	KOICA
2	국내	나라장터 시스템 운영위탁	PL, 사업관리	2015.05 ~ 2022.01	조달청
3	국내	마이코엑스 시스템 개발	PM	2013.04 ~ 2014.12	코엑스
4	국내	수출기업 지원을 위한 웹기반 기술규제 대응서비스 허브구축사업 추진연구	PM	2010.09 ~ 2010.12	지식경제부 기술표준원
5	국내	아시아나 IDT 통합 EDI 중계시스템 구축	PM	2008.07 ~ 2009.02	아시아나IDT
6	국내	산업부문 B2B 네트워크 구축 (물류부문)	PL	2003.02 ~ 2006.06	산업자원부
이하 여백					

1-1-5. 핵심투입 인력 – 기자재 총괄 PL

제안사는 차세대 나라장터 시스템의 아키텍처 설계와 인프라 구축, 키르기스스탄 ODA 사업 경험을 보유한 기자재 전문가를 투입하여 키르기스스탄 환경에 적합하고 운영이 용이한 시스템 인프라를 구축하겠습니다.

핵심투입인력 소개 – 기자재 총괄 PL

차세대 나라장터 아키텍처 전문가



최정원 PL

경력

- 학력: 학사(방송통신대학교 컴퓨터과학)
- 정보처리기사(2013.11)
- SCJP(2010.07), OCP(2010.07), LPIC-1(2008.03), MCP/MCSE/MCSA(2008.01)
- 차세대 나라장터시스템 아키텍쳐 설계 및 인프라 구축
- 키르기스스탄 국가에너지 시스템 개선사업 설계 및 개발
- 요르단 나라장터 구축 개발 PL

◎ 주요 사업 수행경험

순번	구분	사업명	수행업무	투입기간	발주처
1	해외	키르기스스탄 국가에너지 시스템 개선을 위한 중앙집중 AMI 시스템 구축	설계, 개발	2024.10 ~ 2025.09	KOICA
2	국내	차세대 나라장터시스템 구축	PL	2021.07 ~ 2022.01	조달청
3	국내	부천 스마트시티 빅데이터 플랫폼 구축	PL	2021.04 ~ 2021.06	부천시
4	국내	전자정부 클라우드 플랫폼 구축	PL	2020.06 ~ 2021.03	행정안전부
5	국내	교통 빅데이터 플랫폼 구축	PL	2019.10 ~ 2020.03	한국철도공사
6	국내	전력SW 플랫폼 2단계 확장기능 개발	PL	2018.11 ~ 2019.10	한전KDN
7	국내	전력SW 플랫폼 1단계 공통기능 개발	PL	2018.03 ~ 2019.10	한전KDN
8	국내	한국인삼공사 Global MIS 구축	개발	2017.08 ~ 2018.03	한국인삼공사
9	국내	한국식품연구원 MIS 고도화 2단계	개발	2017.02 ~ 2017.05	한국식품연구원
10	해외	요르단 전자조달 시스템 구축	TA, PL	2015.12 ~ 2017.02	KOICA
11	국내	모바일 APP 관리시스템 개발	PL	2015.02 ~ 2015.08	㈜코이션
12	국내	분석지원시스템 개발	PL	2014.09 ~ 2015.01	한국기초과학지원연구원
13	국내	행복청 공무원 통합관사 예약관리 시스템 구축	PL	2014.06 ~ 2014.08	행정중심복합도시건설청
14	국내	세종시 정보센터 기능고도화	PL	2014.05 ~ 2014.07	한국수력원자력전력연구원

1-1-6. 부문별 인력투입 계획

제안사는 컨설팅, 시스템 개발, 기자재 공급, 역량강화, 성과관리 등 각 과업분야별로 선행사업을 통해 검증된 전문가를 투입하여 성공적인 과업 완수와 성과목표 달성을 보장 합니다.


분야별 (주요) 인력투입 계획

과업분야	성명	학력	근무경력	담당업무	소속기관	주요경력
사업총괄	송종인	학사	29년	사업총괄 관리 (PM)	한국무역정보통신	이라크, 요르단, 튀니지 나라장터 구축 PM
품질관리	김수동	석사		품질관리	한국무역정보통신	나라장터 운영위탁 PM, 품질관리
컨설팅	김영구	학사	34년	컨설팅 총괄 PL	큐아이브이	이집트, 이라크, 르완다 나라장터 구축 BPR/ISP
컨설팅	강동순	학사	29년	마스터플랜 수립	큐아이브이	이집트, 이라크 나라장터 구축 BPR/ISP
컨설팅	이윤재	학사	28년	마스터플랜 수립	큐아이브이	베트남, 패루_ 스리랑카, 캄보디아 등 국외 공공 ICT 컨설팅 및 시스템 설계
컨설팅	김병건	박사	18년	법제도 자문	조달연구원	한국조달연구원 전략조달연구본부장, 한-튀니지 전자조달 3각연수 총괄
컨설팅	김민아	학사	23년	물품목록 표준화, 성과관리	큐아이브이	카메룬 나라장터 구축3차 사업 예비조사, KOICA 특허시스템 ODA사업 기획조사 및 성과관리 다수
컨설팅/개발	이상곤	석사	33년	PKI구축	큐아이브이	이집트, 이라크, 요르단, 르완다 나라장터 구축 PKI 적용
시스템개발	배홍길	석사	29년	개발총괄 입찰 PL	한국무역정보통신	이집트 나라장터 구축, 나라장터 운영
시스템개발	심영수	석사	27년	공통/포털 PL	한국무역정보통신	이집트, 이라크, 요르단 나라장터 구축
시스템개발	정치영	학사	26년	계약/지급 PL	한국무역정보통신	이집트, 이라크, 카메룬 나라장터 구축
시스템개발	이진우	학사	24년	입찰 개발	한국무역정보통신	이집트, 르완다 나라장터 구축
시스템개발	장기호	학사	28년	계약/지급 개발	한국무역정보통신	나라장터 운영.유지보수
시스템개발	민 정	학사	28년	카탈로그/쇼핑몰 PL	큐아이브이	이집트, 이라크, 요르단, 튀니지 나라장터 구축, 나라장터 구축 및 운영
시스템개발	이수용	석사	26년	외부연계 PL	씨엔아이	한-튀니지 디지털정부 공동협력과제, 르완다 조세청 통합 포털 구축
기자재공급	최정원	학사	17년	기자재 총괄 PL	큐아이브이	차세대 나라장터 구축, 요르단 나라장터 구축
역량강화	김예솜	석사	7년	초청연수	전자조달지원센터	이라크, 캄보디아 등 조달공무원 역량강화 연수 8건 수행
성과관리	하성흔	석사	28년	성과관리, 본사지원 총괄	한국무역정보통신	이집트 나라장터 구축사업 성과관리, 르완다 전자영수증 고도화 사업 PM

1-2-1. 과업수행 조직도

제안사는 나라장터 컨설팅, 시스템 개발, 기자재 공급, 역량강화, 성과관리 등 각 과업분야별로 선별된 인력들을 중심으로 과업조직을 구성하여 그 역할과 책임을 명확히 합니다. 또한 키르기스스탄 공공조달 분야의 이해관계자들을 대상으로 사업추진전담반을 조직하여 원활한 의사소통과 실무협의 및 합리적인 의사결정 체계를 구축합니다.

과업수행 조직도

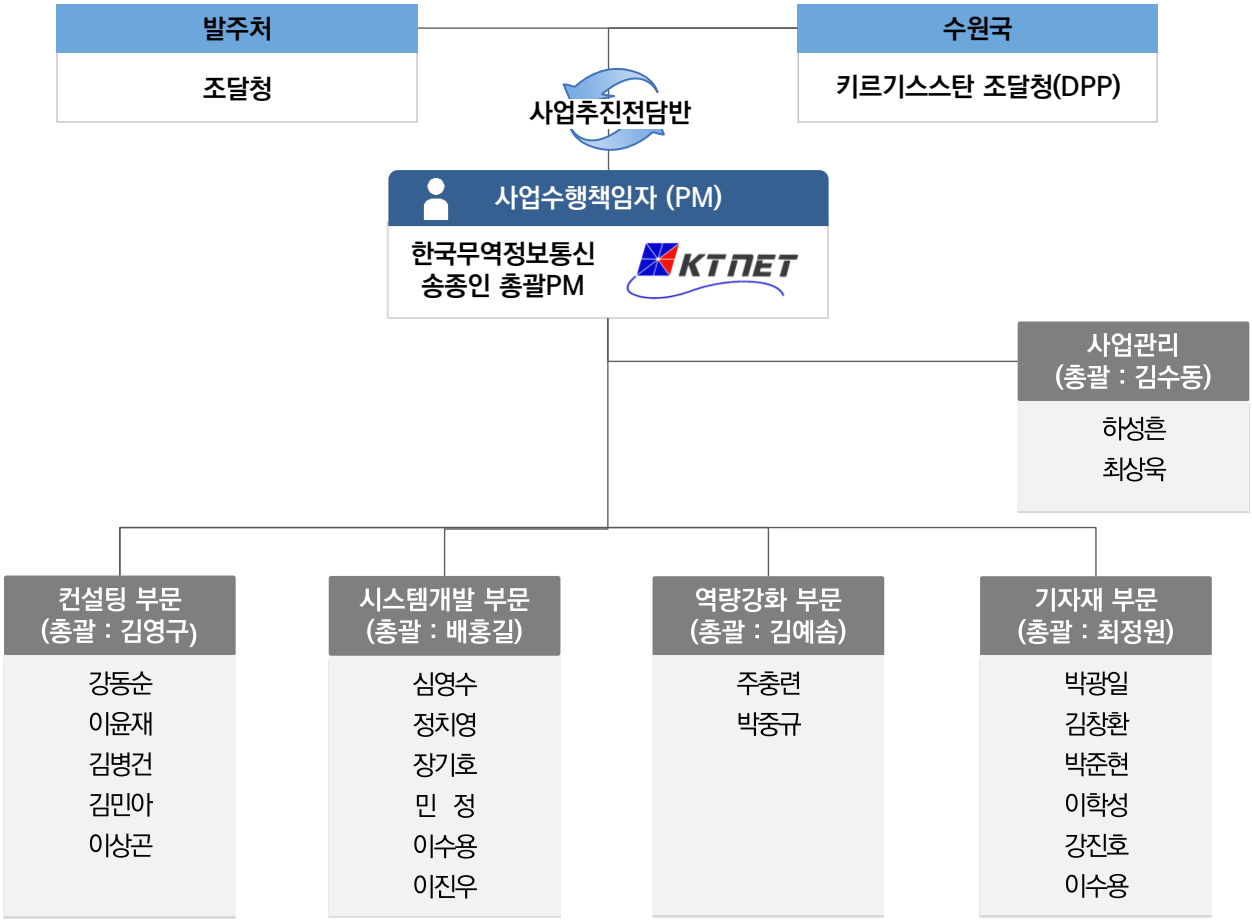

조직 구성의 특장점

① 튀니지, 요르단, 이라크, 이집트 나라장터 구축사업 PM 경험을 보유한 총괄PM 중심으로 수행조직, 발주처, 수원기관 및 세계은행과의 원활한 협력체계 구축

② 선행 나라장터 수출사업의 컨설팅 및 법제도 전문인력으로 수원국 공공조달 업무환경에 부합한 목표모델 설계 및 법제도 자문

③ 나라장터 구축, 운영과 9개국 나라장터 수출 등 풍부한 선행사업 경험을 보유한 개발자들로 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 업무서비스 구현

④ 한국 조달청이 지정한 전자조달지원센터의 연수전문인력을 중심으로 연수생들의 역할별 차별화된 역량강화 프로그램 제공

⑤ 품질, 아키텍처, 기자재 등 요소기술별로 효과적인 과업수행 지원체제 구성

1. 투입인력 현황 및 운용계획 ▶ 1-2. 인력운용계획

1-2-2. 조직별 업무분장

제안사는 제안사의 과업수행 조직뿐만 아니라 발주처, 수원기관 등 사업참여 기관들의 역할을 명확히 이해하여 원활한 의사소통과 업무수행이 진행되도록 합니다..

조직별 업무분장

분야		담당업무
발주처	조달청	• 대 키르기스스탄 원조사업 총괄 • 본 사업수행 전담 및 대외창구 역할
수원기관	키르기스스탄 조달청	• 본사업 주관 및 총괄 관리 • 사업추진반 구성 및 주요사항 의사결정 • 한국 전문가 파견 시 행정지원, 연수생 선발 • 서비스 가동계획 수립, 기자재설치 환경 및 운영조직 준비 • 시스템 운영, 유지관리 예산확보 및 유지보수 체계 구성
수행조직	총괄PM	• 본 사업수행 총괄 책임관리 • 발주처, 수원기관 및 현지 이해관계자들과 사업수행 관련 의사소통 • 국내, 국외 협력업체 관리 및 사업진행 • 수원국 현지 업무 총괄 수행 및 관리 • 일정관리, 진도관리, 변경관리 등 사업수행 전반적인 관리 진행 • 각 부문별 수행 업무 및 일정에 대한 관리와 지원활동 수행
	컨설팅 부문	• 수원국 공공조달 업무프로세스 분석 및 목표모델 설계 • 전자조달 발전방향 수립 • 전자조달 적용을 위한 법제도 자문 • 전자카탈로그 적용체계 수립
	시스템 개발 부문	• 수원국 공공조달 담당자의 요구사항 분석 및 설계 • 포털, 사용자관리, 입찰 등 16개 시스템 개발 및 테스트 • 초기자료 구축 및 기존 전자조달 시스템 데이터 마이그레이션 • 시스템 설치 후 운영지원 및 안정화 지원
	역량강화 부문	• 분야별, 대상별 국내초청연수 및 현지역량강화 교육 계획수립 • 교육일정, 진척사항 관리
	기자재 부문	• 기자재 물품공급계획 수립 및 제출 • 기자재 구성방안 설계 및 검증 • 기자재 운송, 국내 검수 및 현지 검수 • 기자재 설치, 운용방법 교육
	사업관리 부문	• 본사업관련 일정, 자원, 보고 관리 • 각 단계, 공정별 산출물 검토 및 품질관리 • 기자재 검수, 응용시스템 테스트 지원 • 사업 홍보방안 수립 및 홍보물 제작 • 사업성과 도출 지원 및 성과관리 지표 산출

가. 개요


제안사는 전자정부지원사업 사업관리 방안을 준수하고 제안사의 사업관리 방법론을 적용하여 조달청, 키르기스스탄 조달청 및 현지 수행조직과의 긴밀한 협력관계를 통해 일정관리, 품질관리, 전문가 파견, 기술이전을 수행함으로써 리스크를 최소화 하여 안정적으로 본 사업을 완수합니다.

성공적인 사업 수행을 위한 사업관리 전략

KSMP주1) 방법론 적용으로
성공적 사업수행 목표 달성



요구품질 목표달성	납기 내 사업완수	효율적 자원운용	의사소통 체계확립
• 사업요소에 대한 철저한 분석으로 품질 향상 • 실무자의 단계별 검토를 통한 Feed-Back 실시	• WBS를 이용한 가시적인 진척 관리 • 예상위험 및 이슈 해결방안 수립 • 표준 프로세스에 의한 사업 관리	• 요소기술 전문가 및 유사 사업 경험 중심의 조직체계 구성 • 전문기술을 보유한 인력의 적절한 지원	• 사업 이해관계자와 원활한 의사소통체계 가동 및 요구사항 반영 • 지속적인 유지관리 • 안정적 전환 및 기술이전 교육훈련

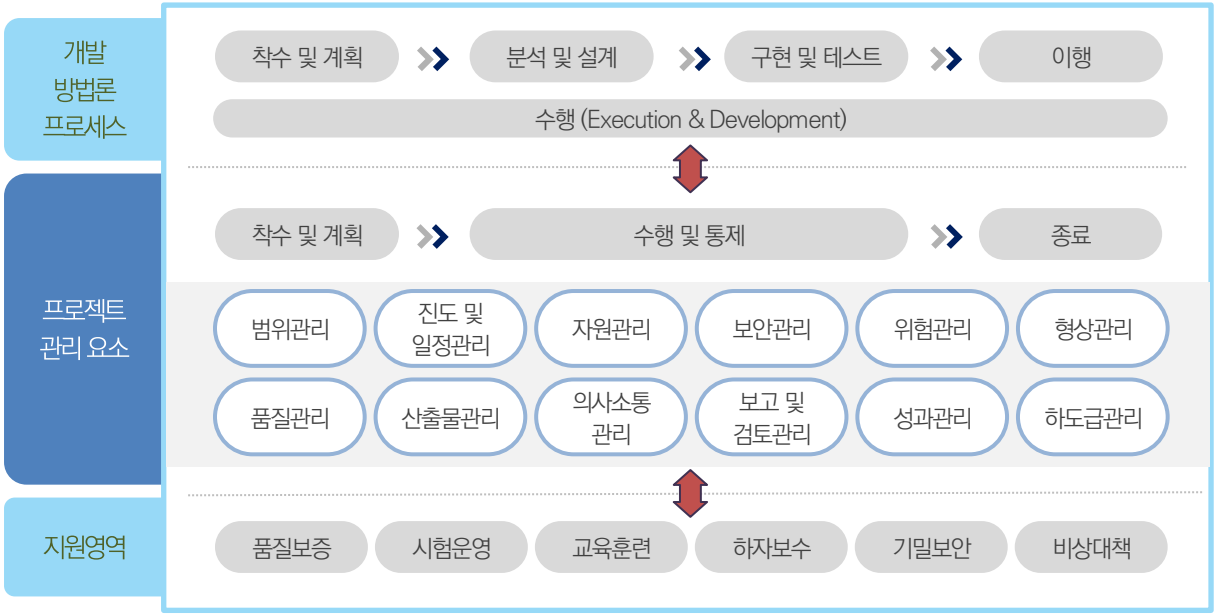

주1) KSMP : KTNET Standard Management Process, KTNET 표준프로젝트관리방법론

나. 사업관리 단계

착수/수행 및 통제/종료의 3단계로 이루어지며, 착수단계에서는 프로젝트 수행을 위한 기준과 프로세스를 정의하고, 수행/통제단계에서는 사업범위, 일정, 비용, 품질, 위험 등의 관리를 통한 프로젝트 수행을 지원하고, 종료단계에서는 결과물에 대한 검증을 실시하여 요구사항에 부합하는 산출물을 제공합니다.

KSMP 사업관리 방법론 사업관리 단계



1 착수 단계

- 사업목표, 사업범위, WBS 확정
- 개발전략 수립
- 표준, 절차의 수립 및 확정
- 수행 환경 및 프로젝트 수행 조직 확정
- 프로젝트 수행계획서 수립 및 확정

2 수행 및 통제 단계

- 프로젝트 계획에 따른 업무 수행
- 사업수행 중의 모니터링 및 통제 및 시정 조치 수행
- 사업수행 관련 산출물 작성
- 산출물에 대한 품질 검토 수행
- 사업의 진행 상황, 변경에 대한 지속적인 의사 소통 및 보고

3 종료 단계

- 사업수행 프로세스, 프로젝트 결과 검수 및 정리
- 추가 업무 필요성 파악
- 사후 지원 계획 수립
- 프로젝트 수행 경험 및 노하우 정리
- 프로젝트 완료 보고

다. 사업관리 영역별 수행활동

사업관리 활동 영역별 관리지표를 사전에 식별하여 체계적 통합관리가 가능한 체계로 명확화 하며, 조달청 및 수원기관과 상시 의사소통이 유지되도록 합니다. 또한, 상호 협조와 의사결정이 필요한 사항은 사업수행 관련 기관과 긴밀한 협의와 협조체계를 구축하여 결정합니다.

사업 수행시 중점관리 영역별 활동내역

관리영역	착수 및 계획 단계	수행·통제단계	종료단계
범위관리	• 제안 / 계약 시 업무 범위 파악 • 범위관리 계획 수립 • 요구사항 정의	• 품질, 비용, 납기, 기술 모니터링 • 요구사항 변경/추적관리 • 변경 요구사항 영향평가	• 요구사항 부합여부 검증/승인
진도 및 일정관리	• 공정 계획 수립 • WBS 도출(작성)	• 진도계획 • 진척실적 파악 및 관리 • 성과 측정 및 분석 • 시정조치	• 진척계획 대비 실행 결과 정리
자원관리	• 인력수급 계획수립 • 인력 투입 • 상용 S/W, H/W 적용 계획 수립	• 투입인력관리 및 교육훈련 • 인력실적 관리 • 상용 S/W, H/W 적용	• 인력운영 보고 • 상용 S/W, H/W 적용 결과 보고
보안관리	• 보안관리 대장 준비 • 자료, 작업장 및 장비, 인원, 문서, 시스템에 대한 보안 계획 수립 • 보안도구 준비	• 보안도구 사용 및 보안교육 실시 • 주기적인 보안 검사 실시	• 보안 관리 결과 검토
위험관리	• 위험요소 식별 • 대응방안 계획 수립	• 위험관리 및 조치	• 위험요소에 대한 대응 결과 검토 • 향후 위험요소 해소 방안 제시
형상관리	• 형상관리 대상 식별 • 형상관리 계획 수립	• 형상항목 기준선 수립 • 형상 변경 통제 수행 • 형상감사 • 백업실시	• 형상관리활동 보고
품질관리	• 품질 요구사항 정의 • 품질목표 설정 • 품질보증계획 수립	• 확인 및 검증활동 수행 • 부적합사항 분석 및 시정조치	• 품질보증활동 보고 • 고객 검수 확인
산출물관리	• 산출물 대상 식별(문서, 소스코드, 라이선스 등) • 문서관리 단계 확립(표준화, 식별, 승인/개정, 보관 등) • 산출물 생산, 승인, 보관 등의 관리 체계 확립	• 수행 단계별 산출물 생성 • 수행 단계별 산출물 검토 및 승인 • 수행 단계별 산출물 보관	• 최종 산출물 보고 및 승인 • 최종 산출물 제출 및 보관
의사소통관리	• 의사소통조직 정의 • 소통 대상, 내용, 경로, 절차, 주기 정의 • 의사소통 방식 수립	• 정기, 비정기 보고 및 의사 교환 • 의사 소통 내용 작성 및 보관	• 의사소통 내용 최종 확인 및 승인 • 내용 제출 및 보관
보고 및 검토관리	• 이해관계자 식별 • 보고 및 검토 계획 수립 • 착수/중간/완료보고	• 정기보고 • 비정기보고	• 보고/검토 후 시정조치 확인 • 고객승인
성과관리	• 프로젝트 계획 및 설계 분석 • 주요 활동과 세부활동	• 성과관리 검토	• 작성내용 확인 및 승인
하도급관리	• 하도급 업체화의 법률 규정 확인 • 대금지불 규정 등의 명시된 하도급 표준 계약서 준비	• 하도급 계약 체결 • 하도급 관리 • 대금지급	• 하도급 업무에 대한 검수 확인 • 최종 대금 지급

2. 사업관리방안 ▶ 2-1. 관리방법론 ▶ 2-1-1. 사업관리 방안

라. 자원관리 방안

프로젝트에 적합한 기술 인력을 적기에 조달하고 배치하기 위한 방안 및 절차를 결정합니다. 이를 위해서 필요한 업무 및 기술요건에 적합한 인원을 선발하고 인력수급 계획을 수립하며 인력자원에 대한 지도, 동기부여, 교육 및 훈련을 통하여 사업의 원활한 수행을 실현합니다.

자원 투입 및 활용을 위한 최선의 방안 제시

적시/최적의 인력투입과 투입인력의 효율적 활용을 통한
성공적 사업 완수

인력수급 계획	투입인력 관리	투입인력 교육훈련	추가투입 및 철수
▪ 효과적 인력 확보 계획 ▪ 원활한 행정 지원 계획	▪ 주간/월간 투입인력 현황 파악 및 보고	▪ 요구되는 기술 수준에 필요한 교육훈련으로 능력 향상	▪ 인원의 추가투입 및 철수, 이동 등의 인원 변동 사항은 고객과 협의를 거쳐 확정

고급인력 확보

전문가정보시스템 활용	프로젝트기술인력관리시스템 활용
▪ 보유 인적자원에 대한 가용현황 관리 ▪ 수급예약 관리 ▪ 자원 수급에 필요한 정보 제공	▪ 업종별 전문인력 관리 ▪ Skill 및 기술등급 관리 ▪ 프로젝트에 필요한 기술 보유자 검색 및 자문 제공

인력변동 원인

인력의 이적	업무량 과다증가	PM의 판단	고객의 교체요구

인력변동 시 대처방안

특정 공정 작업량 과중	▪ 특정 공정의 작업량이 보다 많거나 적게 나타날 수 있음 ▪ 전체 프로젝트 일정에 영향을 끼치게 되므로 작업량에 따라 인력의 변화가 불가피함 ▪ 이와 같은 사항 발생시 고객과 협의하여 작업 인원에 대한 업무변경 및 인원 조달을 시행
프로젝트 관리상 인력변동 발생	▪ 프로젝트 수행의 연속성 및 기간 단축을 위하여 초기에 투입된 인력은 고객과의 사전 협의 없는 교체를 지양하고 프로젝트 관리상 인력 변동이 발생할 경우 적정 인력을 고객과 협의 후 투입 ▪ 투입인력의 이직이 예상된 시점에 신속하게 동급 이상의 인력을 투입하고 업무 인수인계기간을 가져 해당 업무의 공백이 없도록 함

마. 진도관리 방안

기간 내 사업을 완수하기 위해서는 명확한 공정계획과 진척관리가 필수적입니다. 제안사는 품질관리 전문가를 투입하여 납기 사업기간을 고려한 정밀한 공정계획 수립, 주 단위 진척실적 파악, 진척도 분석결과를 토대로 철저한 프로젝트 일정 통제 활동을 수행합니다.

명확한 공정계획 수립과 철저한 진척관리로 진도관리 실시



바. 형상관리방안

형상관리는 프로젝트 기간 전반에 걸쳐 개발되는 각 시스템의 형상항목을 식별하고, 변경사항을 통제하며, 형상상태를 기록 및 유지하는 일련의 활동으로서 각 단계에서 개발되는 시스템이 사용자의 요구사항을 충족하는지 파악하기 쉽도록 합니다. 프로젝트 수행 동안 형상이력에 대해 추적성을 제공합니다.

가시성 및 추적성을 제공하기 위한 형상관리

변경 영향 최소화 | **유지보수/ 재작업 시간절감** | **사업 과정에 대한 가시성**


01 형상계획 수립/ 라이브러리 구축	02 형상식별	03 형상통제/기록	04 형상감사/보고	05 백업실시
▪ 형상관리를 수행하기 위한 형상관리 계획 수립 ▪ 형상 라이브러리 구축 - 형상관리계획서	▪ 형상관리계획서에 정의된 라이브러리/디렉토리 생성 및 접근 권한 설정 ▪ 형상관리 대상 항목 식별 - 형상이력목록	▪ 형상활동 보고 ▪ 형상항목 및 기준선 (Baseline) 설정/변경 통제 ▪ 형상통제 사항에 대해 지속적인 기록 유지 - 베이스라인 통제 목록 - 형상변경 통제목록	▪ 형상항목 별 기준선 (Baseline) 통과에 대한 적절성 여부 확인 ▪ 형상관리 절차 준수 여부 확인 ▪ 형상감사 내용에 대한 보고	▪ 백업관리계획 수립 ▪ 백업관리 실시

조직

- 변경통제위원회 : CCB (Change Control Board)
- 형상관리자
- 프로젝트 팀원

기법 및 도구


- 형상관리 기법
- 형상관리 Tool 활용(Subversion)
- 통합빌드 툴 사용 (Jenkins)
- 프로젝트 관리 툴 (Redmine)



사. 문서관리방안

지연 없는 공정관리, 국제 표준에 따른 품질보증, 유지보수의 용이성을 위하여 단계별 산출물 및 보고서를 작성하며 해당 시기에 정해진 제출 문서 및 CD를 납품합니다. 프로젝트의 표준 및 절차 매뉴얼을 준수해 산출물을 작성하며 기술이전 및 유지보수를 고려하여 작성된 문서의 배포 및 보관을 관리합니다.

품질보증, 유지보수 용이성을 위한 문서관리 방안 적용

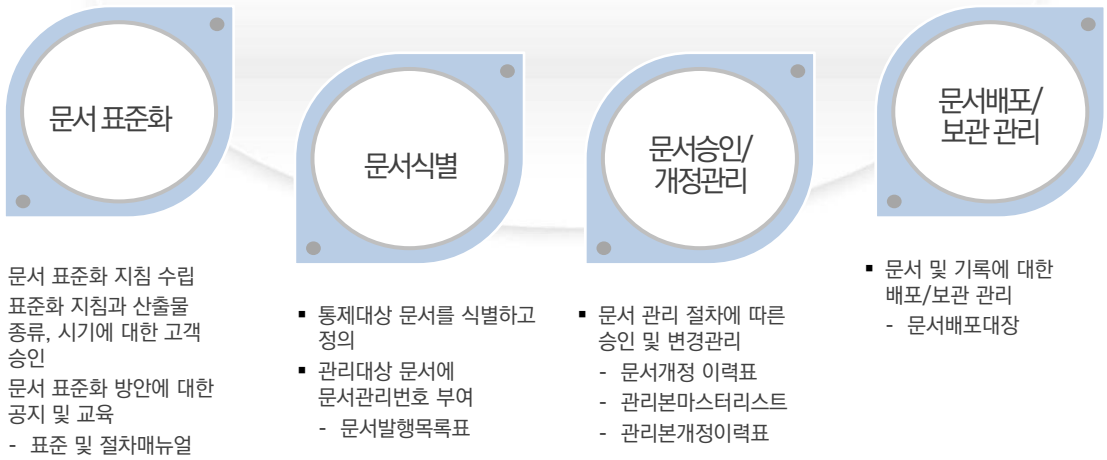

조직	기법 및 도구
• 인수책임자/프로젝트 PM : 문서 제정/개정 승인 • 문서관리자 : 배포문서의 기록 유지, 보관 • 백업관리자 : 매체 문서 지속 보관	• 기법 – 문서/기록 관리 • 도구 – 캐비닛, 바인더 – OA툴(아래아한글, 워드, 엑셀, 파워포인트 등) – 라이브러리

문서관리 지침

1. 캐비닛, 바인더 등의 문서보관 용기 및 전자화된 파일의 보관 디렉토리까지 정의한다.
2. 확보된 문서 라이브러리에 대한 사항(위치, 디렉토리명)은 명확히 기술한다.
3. 공식 산출물은 확정되어 있는 것만을 보관하며, 새로운 문서의 추가 또는 기존 문서의 폐기시 표준 및 절차 매뉴얼의 문서 관리지침에 따라 보관 또는 폐기기록을 남긴다.
4. 사업이 종료됨과 동시에 납품하기로 한 모든 문서를 납품 일정에 맞춰 이관하여 향후 유지보수에 활용토록 한다.

자. 통합관리 방안(1/2)

제안사는 본 사업을 성공적으로 수행하기 위하여, 조달청, 키르기스스탄 정부 및 사업추진TFT와의 적극적인 협력관계 구축을 통해 사업 구성요소간의 연관성을 분석하고 구성요소들의 사업수행 연계, 사업진행일정 연계, 참여 인력의 역할 및 책임 연계 등에 대한 통합관리체계를 구축합니다.

사업의 성공적 수행을 위한 통합관리 방안 적용

사업구성 요소들간 연성에 대한 효율적인 통합관리를 통한

사업의 성공적 수행

효율적인 통합관리

명확한 과업범위 정의 및 관리	통합일정관리	사업추진TF 와 협력구도 구축	효율적인 이행 및 테스트 계획 수립
• 공식적인 변경관리 절차 준수 • 요구사항 검증 및 추적 관리 강화 • 사업수행 경험 및 노하우 적용	• 구성 요소별 사업수행 선후관계 정의 • 선행관계를 고려한 구성요소별 일정계획을 조정한 통합 일정 계획 수립 • 평가및보고사항 반영	• 현지조사 파견 시 사업추진TF의 역할 및 지원사항을 정의 • 성공적인 사업 수행 및 운영체제 준비를 위한 세부 추진계획 수립	• 제안사의 검증, 보완된 테스트 절차를 준수 • 사업자와 수원기관 테스트 조직간의 긴밀한 협력 및 Co-work 체계 구축

조달청, 제안사, 수원국 간의 협력체계

- PMC현지 조사 시 수원기관, 사업추진 TFT간의 협업체계 구축
- 사업이행 이슈에 따른 조달청과의 수시보고체계 구축

사업 위험요소에 대한 조기대응

- 사업이슈를 고려한상세일정관리
- 유지보수 효율성을 높이기 위해 유지보수 인력의 사업 전과정 참여를 통한 기술이전
- 컨설팅, 기자재 업체와의 명확한 R&R 정의

이해 관계자 및 사업 요소 분석

- 사업추진TF 구성 및 1차 이용기관 조달실무자의 세부 참여계획 수립
- 현지 참여 인력에 대한 인력관리체계 수립

성공적 사업 수행을 위한 인력관리

- 수행업무의 Activity화로 일정관리
- 성공적인 사업이행을 위한 Multi Play (실무초청연수 시 개발 및 유지보수 교육, 전문가 파견 시 운영 및 기술이전교육)

기간내 과업완수를 위한 체계적일정관리

자. 통합관리 방안(2/2)

제안사는 프로젝트관리 활동 영역별 관리지표를 사전에 식별하여 체계적 통합관리가 가능한 체계로 명확화 하였으며, 사업주관기관(조달청), 수원기관과 상시 의사소통 활동이 유지되도록 활동합니다. 또한, 불편과 애로사항 등 상호 협조와 의사결정이 필요한 사항은 사업수행 관련 기관과 긴밀한 협의와 협조체계를 구축하여 추진합니다.

통합관리 방안 적용에 의한 단계별 활동내역

관리 영역 \ 프로세스	착수 프로세스	계획수립 프로세스	실행 프로세스	통제 프로세스	종료 프로세스
범위(요구사항) 관리	• 제안 / 계약시 업무 범위 파악 • 초기 사업 범위 결정 • 범위관리 계획 수립 • 요구사항/범위 정의		• 품질, 비용, 납기, 기술 모니터링 • 요구사항 변경/추적관리 • 변경 요구사항 영향평가	• 요구사항 부합여부 검증/승인	
진도 및 일정관리	• WBS 도출 (규모/비용 /일정/자원 계획) • 공정 계획 수립		• 진도계획 • 진척실적 파악 및 관리 • 성과 측정 및 분석 • 프로젝트 계획 변경관리 • 시정조치	• 진척계획 대비 실행 결과 정리	
자원관리	• 인력수급 계획수립 • 인력 투입(교체시 조달청 승인, 동급 이상 대체)		• 투입인력관리 및 교육훈련 • 인력실적 관리	• 인력운영 보고	
보안관리	• 보안관리 대장 준비 • 자료, 작업장 및 장비, 인원, 문서, 시스템에 대한 보안 계획 수립 • 보안도구 준비		• 보안도구 사용 및 보안교육 실시 • 주기적인 보안 검사 실시	• 보안 관리 결과 검토	
위험관리	• 위험요소 식별 • 대응방안 계획 수립		• 위험관리 및 조치	• 위험요소에 대한 대응 결과 검토 • 향후 위험요소 해소 방안 제시	
형상관리	• 형상관리 대상 식별 • 형상관리 계획 수립		• 형상항목 기준선 수립 • 형상 변경 통제 수행 • 형상감사 • 백업실시	• 형상관리활동 보고	
품질관리	• 품질 요구사항 정의 • 품질목표 설정 • 품질보증계획 수립		• 확인 및 검증활동 수행 • 부적합사항 분석 및 시정조치	• 품질보증활동 보고 • 고객 검수 확인	
산출물관리	• 산출물 대상 식별(문서, 소스코드, 라이선스 등) • 문서관리 단계 확립(표준화, 식별, 승인/개정, 보관 등) • 산출물 생산, 승인, 보관 등의 관리 체계 확립		• 수행 단계별 산출물 생성 • 수행 단계별 산출물 검토 및 승인 • 수행 단계별 산출물 보관	• 최종 산출물 보고 및 승인 • 최종 산출물 제출 및 보관	
의사소통관리	• 의사소통조직 정의 • 소통 대상, 내용, 경로, 절차, 주기 정의 • 의사소통 방식 수립		• 정기, 비정기 보고 및 의사 교환 • 의사 소통 내용 작성 및 보관	• 의사소통 내용 최종 확인 및 승인 • 내용 제출 및 보관	
보고 및 검토관리	• 이해관계자 식별 • 보고 및 검토 계획 수립 • 착수/중간/완료보고		• 정기보고 • 비정기보고	• 보고/검토 후 시정조치 확인 • 고객승인	
성과관리	• 주요 활동과 세부활동 및 투입물 • 일정계획(WBS) 수립		• 성과관리 검토	• 작성내용 확인 및 승인	
하도급관리	• 하도급 업체화의 법률 규정 확인 • 대금지불 규정 등의 명시된 하도급 표준 계약서 준비		• 하도급 계약 체결 • 하도급 관리 • 대금지급	• 하도급 업무에 대한 검수 확인 • 최종 대금 지급	


가. 하도급 관리 개요

제안사는 하도급 전문업체 선정 및 계약단계에서부터 『소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침』에 따라 하도급 금액 비율, 하도급 규모, 하도급 목적 및 특성 등을 고려하여 하도급 계획의 적정성 평가를 실시하고 승인 절차를 준수합니다. 또한 『하도급거래 공정화에 관한 법률』 제3조의2에 따른 표준하도급계약서를 활용합니다.

하도급관련 법/제도 완벽한 준수

하도급 거래 정의

■ 발주자로부터 원사업자가 도급을 받아서 수급사업자에 그 전체 또는 일부를 다시 도급을 주거나 또는 원사업자가 발주자가 되어 수급사업자 에게 사업을 맡기는 제반거래 행위를 의미함



하도급 거래관련 법/규정/제도 완벽한 준수



• 하도급 계약 사전 승인 신청



• 하도급 적정성 판단 자기평가표 제출



• 하도급 계약준수 실태 보고서 제출



• 하도급업체 대금지급 확인 증빙자료 제출

관련법 규정

소프트웨어 진흥법 시행규칙 제14조 1항

하도급의 계획 및 적정성 판단 사전공개, 하도급계약의 승인 신청 등
(소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제 19조, 제 20조)
- 과학기술정보통신부고시 제2023-15호 -

나. 하도급 관리 방안

제안사는 본 사업을 수행함에 있어, 소프트웨어산업 진흥법, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」의 관련 규정을 철저히 준수하여 하도급 업체를 활용하며, 대금 지불 공정성을 확보하여 운영합니다.


관련 법규 및 규정 준수를 통한 하도급 업체 보호

◎ 하도급 거래의 법/제도 준수 요건

※ "소프트웨어사업 하도급계약의 적정성판단기준"(과학기술정보통신부 고시 제2013-200호)에 의거 RFP 별지 [서식4] 하도급 계획서 및 [서식5] 하도급 적정성 확인서를 제안서에 포함하여 제출

"행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영지침
(행정자치부고시 제2017-7호) 제19조(하도급 대금지급 등)에 의거 아래사항을 준수

직접인건비는 한국소프트웨어산업협회장이 공표한 평균임금의 100%
* 제경비와 기술료의 합은 직접인건비의 20% 이상



◎ 하도급 거래의 법/제도 준수

1. 본 사업의 하도급의 경우 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제4조(부당한 하도급대금의 결정 금지) 및 '소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침' 제 19조, 제 20조 (과학기술정보통신부고시 제2023-15호)의 규정에 의하여 반드시 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함.
2. 본 사업의 과업의 일부를 하도급 하려는 경우 '소프트웨어 진흥법' 제51조(하도급 제한 등) 1항에 따라 사업금액 100분의 50을 초과할 수 없으나, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 예외사유를 기재하고 사전승인을 요청 함
3. 본 사업의 과업의 일부를 하도급 하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 'SW사업 하도급계약의 적정성 판단기준'' (과학기술정보통신부고시 제2015-114호)의 별지 서식 제2호 및 제3호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출하여야 함
4. 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, '소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리지침'에 따른 '하도급계약의 적정성 판단세부기준'에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음.
5. 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 '하도급 준수실태 보고서'에 의하여 상 • 하반기 2회 보고하여야 함
6. 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 • 운영지침 제19조에 따라 하도급 대금지급 기준을 준수하여야 함
7. 기타 명시되지 않은 하도급 관련 사항은 '소프트웨어산업진흥법' 및 '하도급거래 공정화에 관한 법률', 국가계약법, 회계예규, 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준 등에서 정한 바에 따름
8. '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제3조2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용 함

◎ 하도급 거래 지급방식

구분	주요 내용
지급방식	• 원도급 계약 대금 지급방식을 동일하게 적용하여 지급
지급기준	• 직접인건비는 한국SW산업협회장이 공표한 평균임금의 100% • 제경비와 기술료의 합은 직접인건비의 20% 이상 ※ 간접비 : 직접비(인건비와 직접경비)에 포함되지 않는 비용
지급시기	• 사업대가 : 사업대가 수령 시 15일 이내 현금지급 – 5일 이내에 조달청에 지급내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 통보

다. 하도급 예정 계획

제안사는 성공적인 사업 수행을 위하여 각 분야에 전문성을 보유한 하도급 업체를 선정합니다.
국내에서 나라장터 구축, 운영, 고도화, 차세대 나라장터 컨설팅 및 구축사업에 참여한 업체와 나라장터 해외수출 사업 경험을 보유한 업체들과 협력하여 사업의 완성도를 제고합니다. 제안사는 하도급사 관리 기준을 철저히 준수하고, 수행결과는 주사업자의 책임하에 품질을 보증합니다.

성공적인 사업수행을 위한 하도급 계획

◎ 하도급 계획서 (별지 제4호 서식 1/2)

소프트웨어사업 하도급계획서(적정성 평가 확인서)				
사업명	키르기스스탄 나라장터 시스템 구축용역		사업기간	42개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호	㈜한국무역정보통신	대표자	고 진
	사업자등록번호	120-81-02922	소재지	서울특별시

□ 하도급 예정 계획

하도급 계약명	하도급 금액 비율	하수급인상호(사업자번호)
키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 컨설팅	21.4%	㈜큐아이브이(105-87-55500)
키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 시스템 개발	10.5%	㈜소프트아이텍(314-81-36537)
키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 시스템 개발	12.2%	㈜아이아이티(806-87-01316)
키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 초청연수	2.6%	대전대 산학협력단(305-82-13385)
합계 :	**46.8%**	

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율
- 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 단순물품구매 예정액*) X 100
  *「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 서식4에 따른 단순물품구매 · 설치용역
- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: 해당사항 없음

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

○ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○)

○ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유 : 각 사별 하기 사유로 하도급계약을 하고자 하며, 주사업자의 책임하에 하도급 관리감독을 강화하고 수행결과는 주사업자의 책임으로 품질보증 하겠음
- 큐아이브이, 아이아이티 : 본 사업의 입찰참가자격 중 하나인 정보통신공사업(0036) 미보유로 공동수급 참여불가
- 소프트아이텍 : 일부 시스템 개발일부만 참여로 4년간 공동책임 담보 부담으로 하도급 희망

□ 표준 하도급계약서 사용 여부

○ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: 해당사항 없음

다. 하도급 예정 계획

성공적인 사업수행을 위한 하도급 계획

◎ 하도급 계획서 (별지 제4호 서식 2/2)

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

2025년 06월 05일

공동수급체 대 표 상호: ㈜한국무역정보통신
대표자 : 고 진 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀 하

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.
  단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.
- 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율*이 100분의 10이하이면서「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여

* 하도급 금액 비율 : 원도급의 총 입찰금액 대비 하수급 총 합계금액의 비율
(주의) 개별 하도급 비율이 아닌 하도급 전체의 총 합계금액 비율임

※ 대표자 날인본은 기술제안서 6. 소프트웨어사업 하도급 계획서 로 제출 함

다. 하도급 예정계획

◎ 하도급 계획서 적정성 확인서 (별지 제5호 서식 1/2)

사업명	키르기스스탄 나라장터 시스템 구축용역		사업기간	42개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호	㈜한국무역정보통신	대표자	고 진
	사업자등록번호	120-81-02922	소재지	서울특별시

□ 하도급 예정 계획

하도급 계약명	하수급인상호	하도급 계약명	하도급 금액 비율
㈜한국무역정보통신	㈜큐아이브이	키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 컨설팅	21.4%
㈜한국무역정보통신	㈜소프트아이텍	키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 시스템 개발	10.5%
㈜한국무역정보통신	㈜아이아이티	키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 시스템 개발	12.2%
㈜한국무역정보통신	대전대 산학협력단	키르기스스탄 나라장터시스템 구축용역 초청연수	2.6%
합 계			46.8%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율
- 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 단순물품구매 예정액*) X 100
  * 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액
- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: 해당사항 없음

2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : 해당사항 없음

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

○ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○)

○ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유 : 각 사별 하기 사유로 하도급계약을 하고자 하며, 주사업자의 책임하에 하도급 관리감독을 강화하고 수행결과는 주사업자의 책임으로 품질보증 하겠음
- 큐아이브이, 아이아이티 : 본 사업의 입찰참가자격 중 하나인 정보통신공사업(0036) 미보유로 공동수급 참여불가
- 소프트아이텍 : 일부 시스템 개발일부만 참여로 4년간 공동책임 담보 부담으로 하도급 희망

□ 표준 하도급계약서 사용 여부

○「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용
- 표준계약서 활용 여부: (○) □ 해당사항에 대하여 명확하게 표기(O 또는 X)
- 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: 해당사항 없음

○「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: 해당사항 없음

다. 하도급 예정계획

◎ 하도급 계획서 적정성 확인서 (별지 제5호 서식 2/2)

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

2025년 06월 05일

공동수급체 대 표 상호: ㈜한국무역정보통신
대표자 : 고 진 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀 하

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 「소프트웨어 진흥법」제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다.
- 국가기관등의 장이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.

※ 대표자 날인본은 기술제안서 6. 소프트웨어사업 하도급 계획서로 제출 함


2. 사업관리방안

2-2. 일정관리 (1/2)

제안사는 컨설팅, 시스템 개발/구축, 기자재 납품/설치, 역량강화 및 초청연수, 보고 및 검토, 산출물 작성 등 사업의 범위를 명확히 식별하여 일정계획을 수립하여 관리합니다. 컨설팅 종료단계 부터 시스템 개발 공정에 착수하여 26년 연내 시스템 구축을 완료 합니다.

추진일정 계획 (1/2)

◎ 컨설팅, 시스템 구축, 역량강화

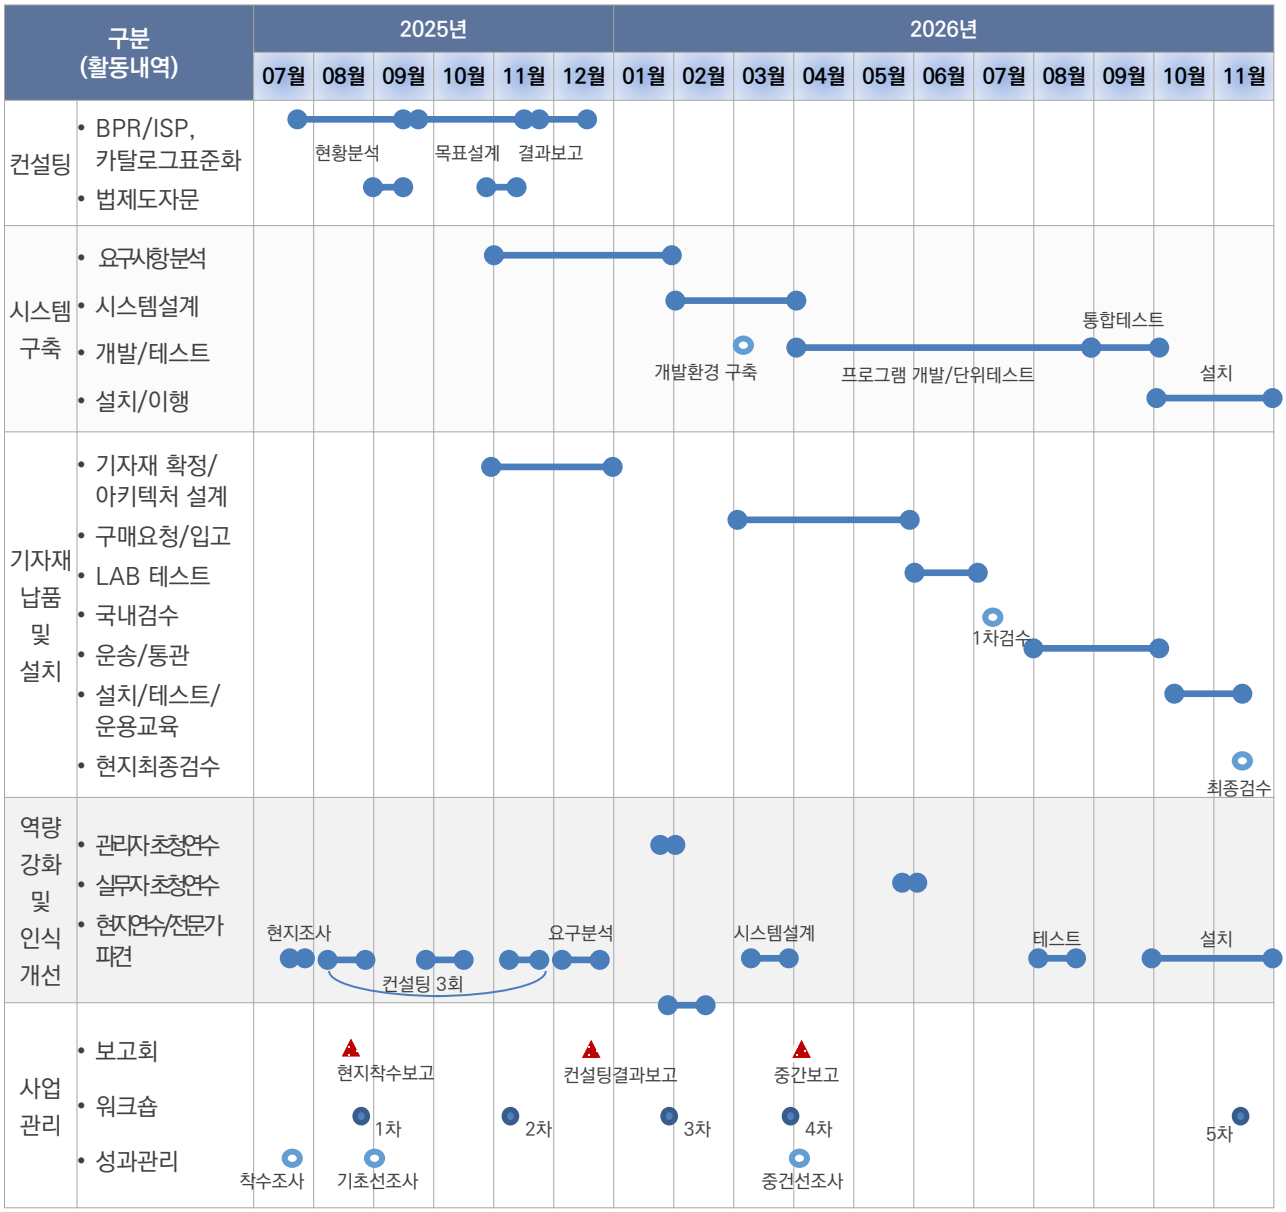

※ 상기 일정은 조달청 또는 수원기관과의 협의 하에 필요시 변경 가능함.

2. 사업관리방안

2-2. 일정관리 (2/2)

제안사는 26년 4분기 중에 시스템 설치를 완료하고 연내 시범운영을 진행하여 사용자 가입과 입찰공고 등록 서비스를 우선 시작하여 단계적 운영개시를 진행합니다. 이를 통해 27년 하반기 부터 본격 서비스를 개통하여 운영 성과를 창출하겠습니다.

추진일정 계획 (2/2)

◎ 운영지원

구분 (활동내역)		2026	2027				2028				2029
		4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
안정화 지원	• 시범운영 • 운영지원 파견 / 현지연수 • 추가 운영지원 파견 (총괄PM)			서비스 개통	1차	2차 3차 4차		5차		6차	
			시범운영지원/오픈 준비 (추가제안)								
사업 관리	• 보고회 • 성과관리	성과측정		개통식		성과측정				성과측정	종료보고 성과보고

※상기 일정은 조달청 또는 수원기관과의 협의 하에 필요시 변경 가능함.

2-3-1. 과업의 위험관리 계획

제안사는 사업의 위험요소를 식별하여 평가하고, 이 위험을 극복하기 위한 다각적인 해결방안을 마련함으로써 불확실한 사항 및 결과를 제거하거나 위험을 회피하는 방법으로 위험을 감소시킵니다. 제안사는 다양한 형태의 프로젝트 수행경험을 활용하여 위험발생을 사전에 방지하고 선제적인 위험완화 활동을 통해 사업을 안정적으로 추진합니다.

다양한 프로젝트 수행경험으로 선제적 위험 완화 활동

잠재 위험요소의 조기식별 및 사전대응을 통한

위험발생의 최소화로 사업의 성공 보장



위험 식별 및 등록

위험 징후로부터 식별

- 프로젝트를 수행 과정에서 식별
- 비생산적인 회의의 지속, 팀원사기의 저하, 고객과의 갈등의 증가 등 징후의 감지를 통해 위험을 식별

프로젝트 진척결과로부터 식별

- 프로젝트 진척 결과의 계획 대비 실적을 비교 분석
- 차이로 인한 향후 프로젝트의 문제점을 예측

팀 회의


- 프로젝트 팀 내부 또는 고객과의 회의를 통하여 이슈를 식별
- 프로젝트 현황 공유를 통하여 이슈를 사전에 식별

타 프로젝트로부터 식별


- 유사한 프로젝트에서 발생한 위험에 대한 원인 및 정보를 파악하여, 위험을 식별

수행 방안

위험관리 절차

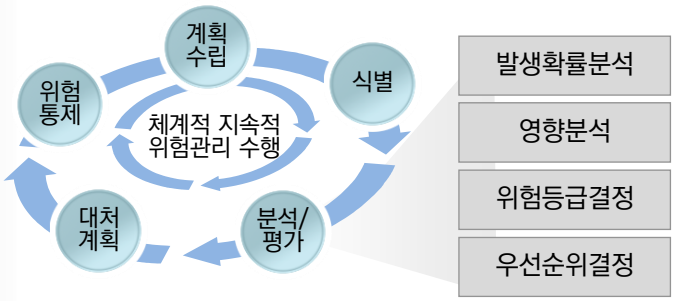

정기적 위험요소 점검

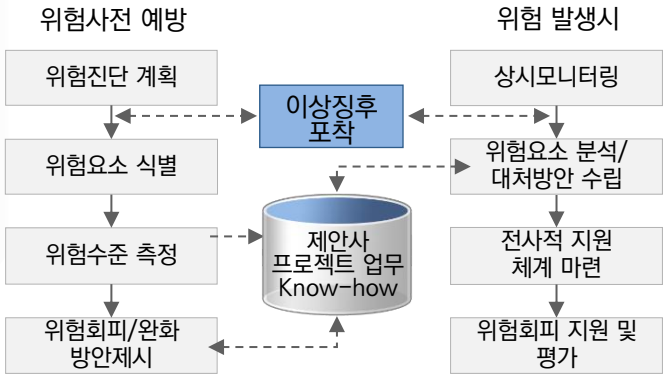

2-3-2. 위험요소 관리 기준

제안사는 위험요소 식별 및 관리를 위한 기준으로써 위험요소 관리 Matrix와 영향도 평가지침을 활용하여 위험에 대해 신속하고 적정하게 대응합니다.

신속하고 적정하게 대응을 위한 위험요소 관리 기준

위험요소 관리 Matrix

※ 비고: 위험요소 산정은 위험중요도 및 위험영향도 평가 테이블을 기준으로 함

상	중	상	상
중	하	중	상
하	하	하	중
위험중요도 / 위험영향도	하	중	상

위험중요도 평가 테이블

위험중요도	설명
상(3)	프로젝트 완료에 영향을 미칠 수 있는 위험으로, 전담인력 배치 및 주기적인 관리가 필요함.
중(2)	완화되지 않았을 때 프로젝트 일정, 비용, 품질에 영향을 주는 위험으로 위험 관리 담당자의 주기적인 모니터링이 필요함.
하(1)	발생 가능성과 영향도 모두 '중' 이하인 경우로 추후 High Risk가 되지 않도록 관리해야 함.

위험영향도 평가 테이블

영향도		위험 영향도가 커짐		
		하(1)	중(2)	상(3)
관리 분야	일 정	1주~2주	2주 이상	-
	설명	팀 내에서 해결이 가능한 이슈	일정 및 인력 재배치에 영향 팀 간의 조정절차를 거쳐야 해결이 가능한 이슈	PM의 의사결정이 필요한 사안으로 일정 지연, 변경이 불가피하여 추가비용 발생이 예상

2-3-3. 부문별 위험요소 대응방안

제안사는 위험요소 관리기준에 따라 위험 발생 전 위험요소에 대한 대응체계를 갖추어 위험등급 5등급 이상의 항목에 대해서는 특별위험요소로 간주하여 상시 위험관리 활동을 수행합니다.

부문별 위험요소 대응방안 관리

부문	위험요소	중요도	영향도	위험 등급	관리계획
인력관리	인력 변동	1	3	4	• 초기 투입 인력변경은 고객과 사전협의 • 변동 시 기술등급이 동급이상이며 조달청 나라장터 사업을 이해하는 인원을 우선 선정 조건으로 고려 • PM 유고 시 사업 연속성 확보를 위해 동급이상의 PM인력으로 교체
	참여원간 업무불화	1	3	4	• 업무회의 및 수시회의를 통한 최적의 업무협력태세 구축 • PM과 팀원간의 주기적인 면담을 통해 해결
일정관리	관련 기관의 의사결정지연	2	3	5	• 빈번한 교류로 변화요소를 사전에 파악하고 협의, 조정, 절충을 통해 진도의 지연을 미연에 방지
	진척관리미비	2	2	4	• 수행 과정의 단계를 세분화시켜 수행 진도의 적합성을 수시로 판단하고 지연요소 발생 시 추가 인력 등의 투입으로 납품 공기 준수
품질관리	서버 /네트워크 누락	1	3	4	• 분석/설계단계 종료 시 및 시스템 통합테스트 이전 시점에 제안사의 전문조직에 의한 성능테스트 실시 • 단위테스트 단계부터 철저한 테스트로 잠재적 성능 저하요인 제거
	품질저하	2	2	4	• 제안사의 전사 품질지원조직의 정기적인 품질감사 수행
의사소통	의사소통 경로미비	2	3	5	• 현지 조사 시 수원국 측의 업무 담당자 지정 요청 • 실무진과의 업무협의를 통한 최적의 의사소통 채널 구비 • 메신저, FAX, 이메일, 웹기반 업무지원시스템 등을 통하여 의사소통을 지속
	언어문제	3	1	4	• 우선적으로 영어가 가능한 인원을 수행원으로 배정 • 사업수행에 언어적인 문제발생시 통역요원 투입

※ 비고
- 중요도 : 위험이 발생했을 경우에 관리의 중요성 의미하며 1 ~ 3단계로 구분되어지며, 숫자가 클수록 중요도가 높음
- 영향도 : 위험이 발생했을 경우에 사업에 미치는 영향의 정도를 의미하며 1 ~ 3단계로 구분 숫자가 클수록 영향력이 큼
- 위험등급 : 중요도 + 영향도, 숫자가 클수록 위험 가능성과 영향이 높음

2-3-4. 과업별 위험요소 관리 기준

제안사는 과업별 위험요소를 조기에 식별하고 체계적이며 효과적인 위험관리를 실시합니다.

과업별 위험요소 대응방안 관리

부문	위험요소	중요도	영향도	위험등급	관리계획
시스템 개발	과업목적과 배치된 업무범위 증대	1	3	4	• 경험 있는 요구조건분석능력을 지닌 전문가를 투입함으로써 과업목적과 관련 없는 불필요한 과업 범주의 증대를 예방함
	무분별한 요건 변경	2	3	5	• 철저한 변경관리절차수행을 통한 시스템 개발 공기준수 및 안정성 확보 • 요건분석단계와 국내초청연수를 통해 시스템 구축의 업무 노하우 전수해서 요건변경 최소화
	규제위반	2	2	4	• 수원국, 한국, 기관의 법규정 및 법적 요구사항 준수 • 법률적 책임 수반할 수 있는 위험요인 사전 검토
기자재 납품	요구사양의 불일치	1	2	3	• 해당 기종의 상위 기종으로 납품
	납품 중 기자재 일부 파손	2	3	5	• 장비의 특성을 고려하여 전체 기자재 진공 포장 및 방습제 투여 • 파손에 예민한 장비를 선별, 개별 포장 요청
	설치 전 기자재 관리 미흡	1	3	4	• 기자재 보관 책임자 선정 및 기자재 관리 장소 확보 요구 • 기자재 관리 장소 기준 선정 및 제시
전문가 파견	정치적 불안	3	3	6	• 발주처, 수원기관과 협의하여 일정 조정
	테러/납치대응	3	3	6	• 현지파견 전 현지 문화, 정치 및 사회상황에 대한 철저한 사전교육 수행 • 주 키르기스스탄 한국대사관의 업무지시를 준수하여 안전 확보
	질병	2	3	5	• 풍토별의 위협에 대해 현지 체류기간 및 파견 종료 후 잠복기간에 대해 철저히 파악하여 질병 여부 확인 • 발생을 대비하여 파견 전문가의 보험 가입
	안전/재해	2	3	5	• 수원국의 정치, 경제, 사회적 불안정으로 인한 치안 악화 등을 사전에 확인 • 파견 전문에 철저한 사전 교육 실시

2. 사업관리방안 ▶ 2-4. 사후관리

2-4-1. 사후관리 개요

제안사는 전자조달시스템에 대한 수원기관의 선진적이고 안정적인 운영역량 배양을 위하여 시스템 구축 및 운영에 적용된 기술, 축적된 노하우, 유지보수 방안 등에 대한 효율적인 교육 및 기술이전을 실시합니다.

안정적인 운영역량 배양을 위한 교육 및 기술이전 실시



2-4-2. 사후관리 방안


제안사는 나라장터 구축 운영, 9개국 수출 성공경험 및 현지 IT 전문업체인 CNITech, Microret 와의 협력을 바탕으로 현지기업의 1차 문제해결, PM의 6개월 현지 상주와 핵심인력의 분기별 맞춤형 투입을 통해 자연스러운 기술 이전을 수행합니다.

수출 성공경험과 현지 전문업체와의 협력으로 기술 이전 수행

한국 나라장터 발전 방향 참조



성과관리 지표 구체화 및 목표 달성

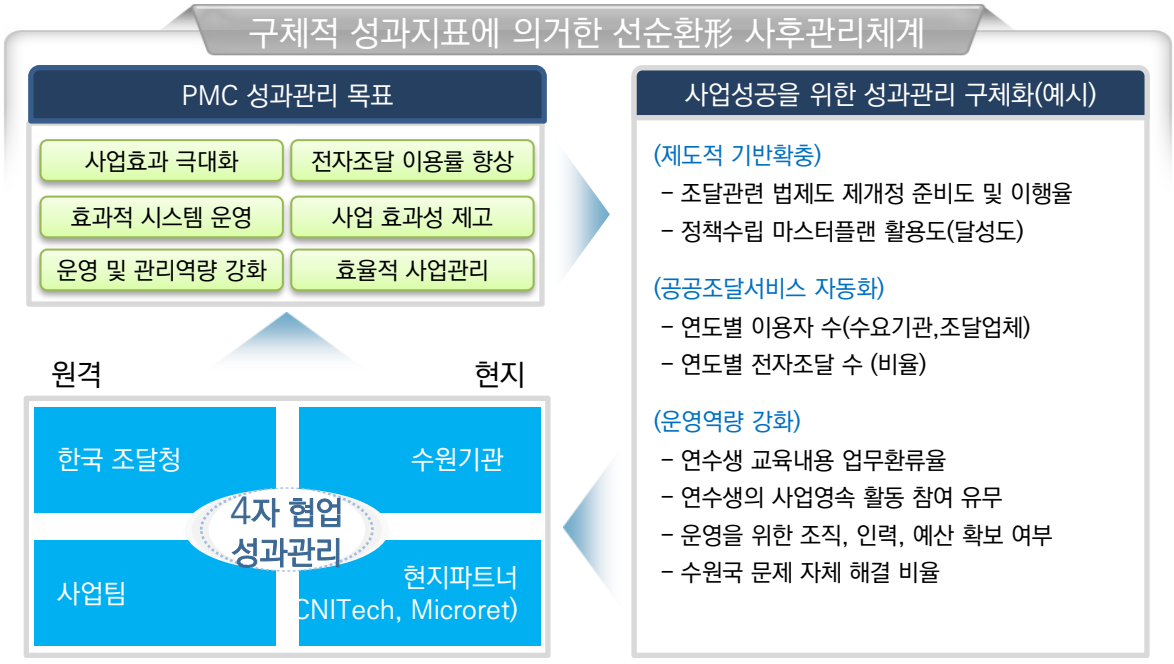


가. 목적 및 프로세스


제안사는 사업의 요구사항들이 완벽히 반영되어 구현될 수 있도록 객관적 지표를 활용한 각 업무의 진척도 및 산출물 관리를 통하여 프로젝트 추진 과정을 모니터링하고 보고하여 이해관계자들의 원활한 의사소통과 조정이 이루어지도록 합니다.


보고 및 검토 계획의 목적

○ PDM상 객관적 입증지표를 활용한 프로젝트 모니터링 및 보고

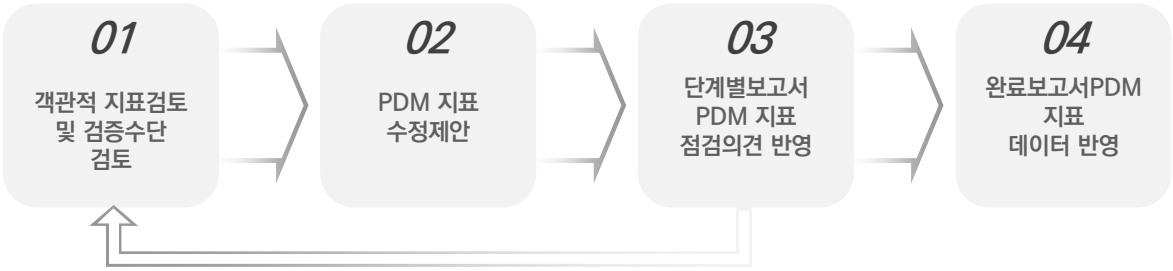

○ 사업요소별 과업수행 보고 프로세스



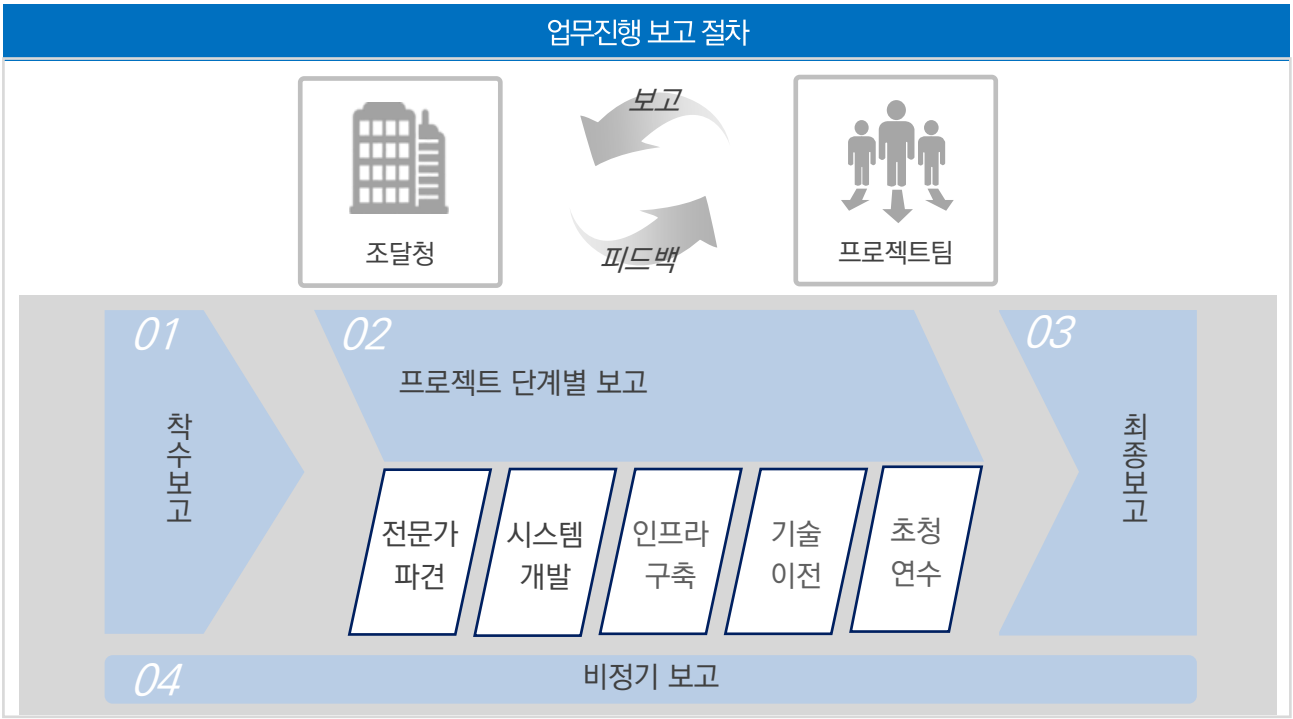

나. 업무보고 계획

제안사는 사업수행 중 업무회의 및 보고를 통하여 본 사업에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 지속적으로 파악하고 작업일정 및 작업내용상에 나타난 문제점에 대하여 최적의 해결방안을 도출하고 수행합니다.

업무보고 계획

업무보고

1 착수 보고

- 사업자 선정 이후 7일 이내에 계약서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행 계획서를 작성하여 제출
- 본 사업의 과업범위, 추진 일정, 인력투입, 핵심 업무 수행계획, 위험관리 등에 대한 사업관리 방안 및 절차 보고
- 계약 체결이후 수원기관과 함께 현지 착수보고회 실시하고 프로젝트 조직과 추진계획, 성과관리 계획 등을 공유

2 프로젝트 단계별 보고

- 사업수행 절차에 따라 전문가 파견 및 설치 2주 전 계획서 제출
- 연수초청 1개월 전 교육내용 제출
- 추진계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 구체적인 진행사항 및 추진상 문제점 및 대안 등에 대한 결과 보고서 제출
- 지원계획에 따른 유지관리와 운영에 대한 매뉴얼 작성 제출 (한글 및 영문)

3 완료보고

- 계약만료일 이전 계약서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 최종 산출물에 대한 최종보고서를 사업종료 전 작성 제출
- (국문보고서/영문요약본)
  - 사업의 이력 및 의의
  - 품질상의 주요 검토 결과
  - 사업기간 내 활동내역
  - 향후 사업 추진방향 및 계획

4 비정기 보고

- 긴급한 사항 발생 시 수시로 보고
  - 조달청의 요구에 의한 보고
  - 수원기관 사업추진전담반 이슈사항 보고

다. 보고내용

본 사업의 특성을 고려하여 사업의 성공적인 수행을 위해 조달청과 사업 수행조직간 주기적, 긴밀한 의사소통 및 업무진행관리 사업진행 상황을 정기 및 비정기적으로 보고합니다. 이와 같은 업무보고를 통해 원활한 진척관리와 위험요소의 사전 도출 및 해결을 수행합니다.


정기/비정기 보고

구분		보고내용	보고서
정기 보고	착수보고	• 사업목적 및 범위 • 산출물 목록 및 정의서 • 사업관리 및 품질관리 방법 및 절차 • 사업추진일정 및 사업단 구성현황 • 기술이전 및 교육계획 • 기타 사업추진관련 선행사항	• 사업 수행계획서
	주간 업무보고	• 주간업무 계획대비 실적점검 • 차주 업무계획 수립 • 이슈사항 파악	• 주간보고서
	월간 업무보고	• 월간 업무계획 대비 실적점검 • 주요 추진내용 및 단계별 산출물 • 기술인력 투입현황 • 차월 계획사항 및 계획변경사항 • 주요 의사결정 및 협조사항 • 위험 및 이슈사항 파악 • 기타 주요 특이사항	• 월간보고서
	완료보고	• 사업수행계획서의 업무범위에 포함된 사항과 관련한 최종산출물 완료보고 • 사업 종료 시 전체 사업과 기술 수행결과 보고 • 사업 단계별 산출물 • 개발완료보고서 문서 및 CD제작/제출	• 완료보고서 • 산출물 CD
비정기 보고	수시보고	• 긴급한 사항 발생시 • 위험 및 이슈관련사항	• 수시보고서
	전문가 파견	• 사전조사/ 시스템 요구분석/ 설치전문가 파견 시 파견계획서 및 파견결과보고	• 전문가파견계획서 • 전문가파견 결과보고서
	현지연수	• 연수 계획 수립 • 연수 구성안 및 연수 내용, 결과 보고	• 과정개요서(CI) • 현지연수 실시계획서 • 현지연수 결과보고서
	초청연수	• 연수 계획 수립 • 연수 구성안 및 연수 내용,결과 보고	• 과정개요서(CI) • 초청연수 실시계획서 • 초청연수 결과보고서
	검수	• 국내/ 현지 검수에 필요한 검수계획 및 결과	• 기자재검수 요청서 • 기자재검수 결과보고서

라. 모니터링 계획

제안사는 사업의 착수, 계획, 실행 및 종료 시점까지 계획수립, 검토활동, 시정조치 및 결과확인 등 사업관리 활동을 특화된 프로젝트 관리체계에 의거하여 베이스 라인과의 차이점을 상시 모니터링 함으로써 체계적인 사업관리 활동을 수행 합니다.

사업관리 모니터링

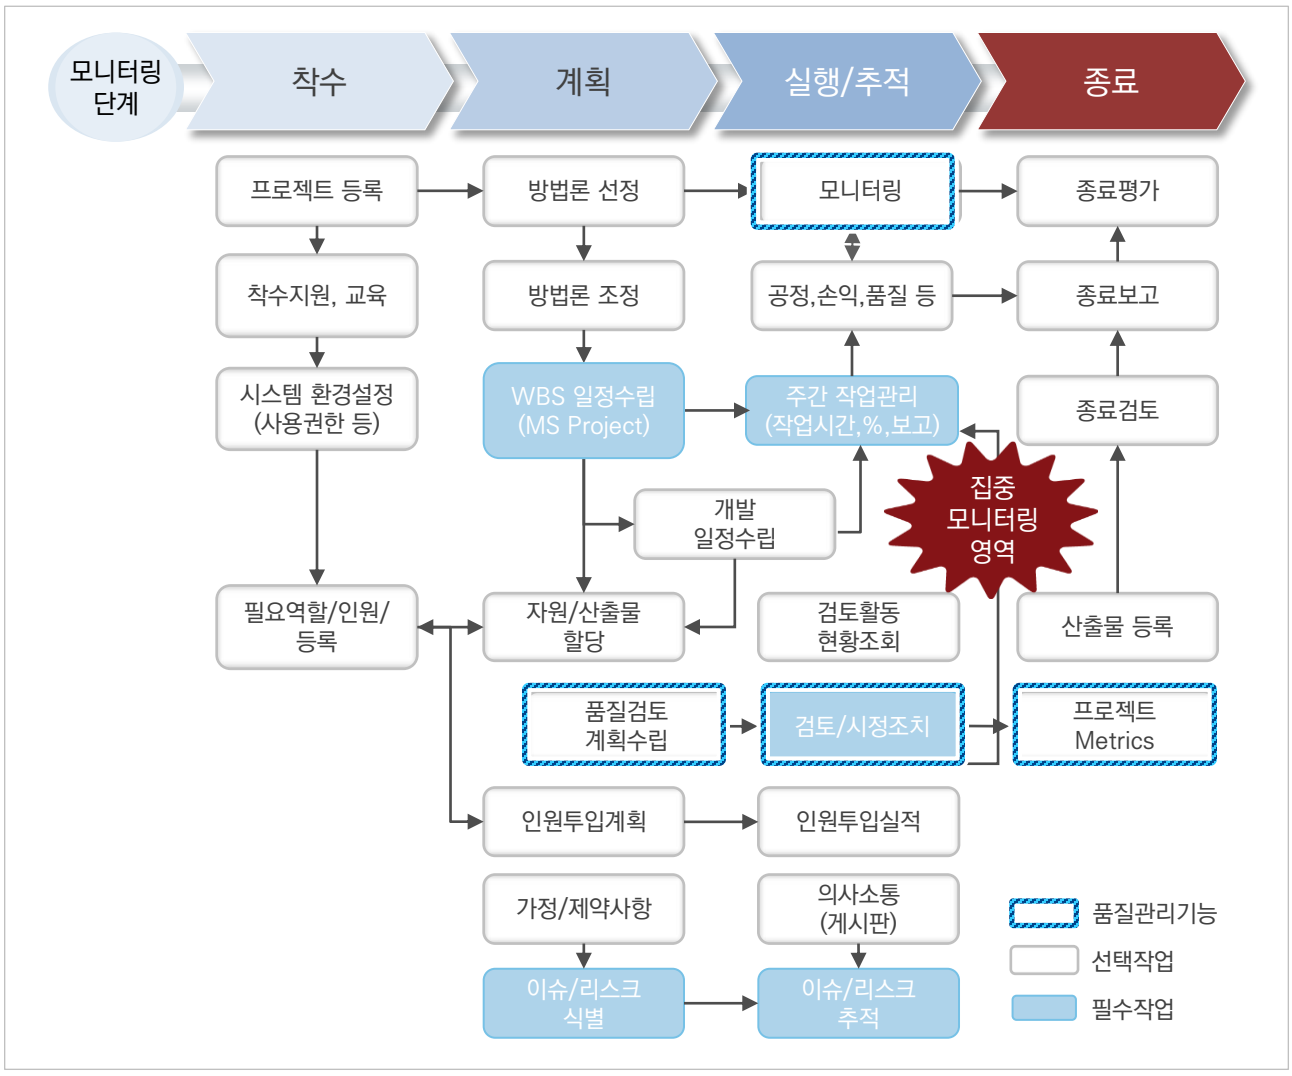

모니터링 항목


- PDM 지표
- 진척률 이슈 및 리스크
- 검토대상의 산출물의 검토 완료율
- 부적합 건수, 시정조치 요구 건수, 시정된 건수, 부적합률, 시정 조치율
- 사업수행계획서, 주/월/분기별 과업진도보고, 기타 과업단계별 사업수행결과보고서, 각 절차별 결과보고회

마. 성과관리 계획

제안사는 본 사업을 통해 키르기스스탄 공공조달의 효율성 및 투명성 강화와 공공재정관리 혁신지원을 성과목표로, 사업의 **성과관리를 위한 모니터링 및 평가계획**을 수립합니다. 그리고 세부 활동을 통해 PDM목적달성을 위한 성과관리 활동을 수행 합니다.

성과관리 방안

성과관리 개요

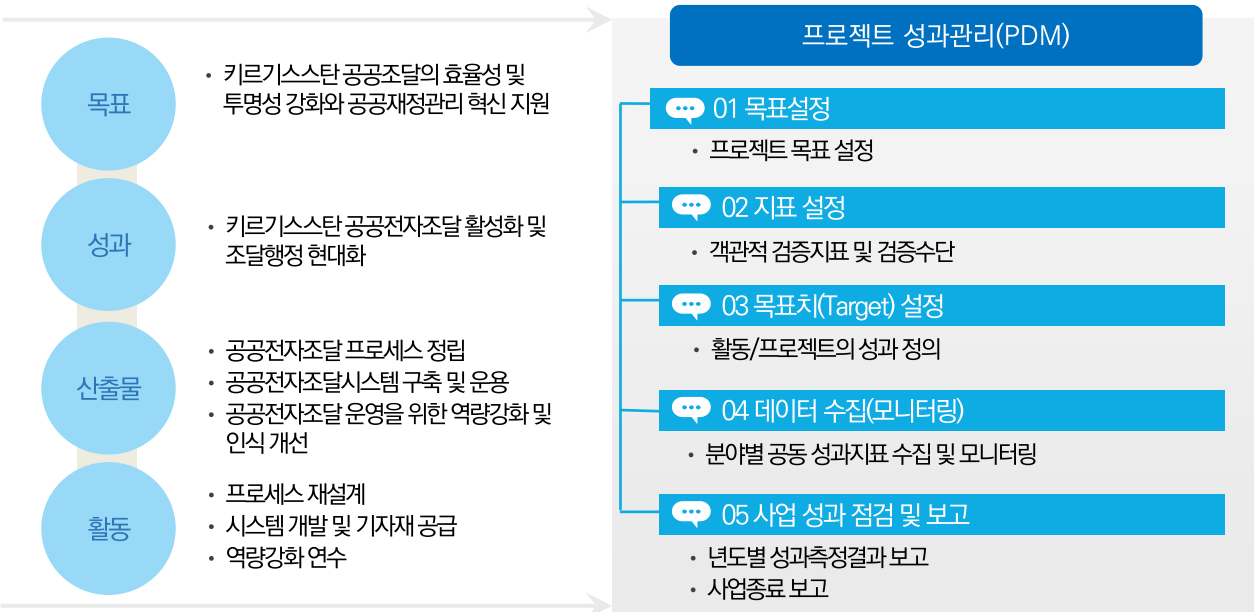

성과관리 추진 계획

프로젝트가 계획수립 당시 설정한 목표와 목적을 달성하고 있는가를 PDM에 기초하여 측정

구분	시기	달성 목표	지표수집 담당	수집방법
PDM 및 지표 확정	2025년 3Q	PDM 및 지표 확정	성과관리 전문가 및 현지 사업추진전담반	통계자료 설문조사 인터뷰 사업산출물
역량 강화	2025년 3Q	컨설팅 현지연수, 기초선 조사		
	2026년 1Q	관리자 초청연수		
	2026년 2Q	제3국 방문연수		
	2026년 3Q ~2028년 4Q	테스트, 설치 및 운영' 파견기간 중 총10회 이상 현지연수		
시스템 개선/ 개발	2026년 4Q	중간선 조사, 전자조달 시스템 구축완료		
워크샵	2025년 3Q, ~2026년 2Q	워크샵 3회		
성과관리 결과보고	2026년 1Q	완료보고		

바. 사업홍보 계획

제안사는 효과적인 사업 홍보 활동을 위해 언론홍보, 홍보 영상물 제작, 대외 보고회 등을 실시합니다. 다양한 이해관계자 간 사업의 이해와 공감대 형성, 참여확산, 변화 저항 최소화 기대 등의 성과가 발생할 수 있도록 최적의 홍보 방안을 수립합니다.

홍보 추진방안 및 단계별 홍보 전략

홍보추진 방안

전자조달 사용자 활성화의 타당성

- 전자조달 도입의 필요성
- 전자조달의 우수성
- 전자조달 사용자 활성화의 타당성과 기대효과
- 국내외 성공사례 전달

한국 정부 협력 사항

- 한국이 수원기관에 전자정부 기반 마련 및 확산을 위한 노력 및 협력사항

현지 주요보고 언론 홍보	• 착수보고, 종료보고, 사용자 워크샵 등 주요 행사 시 방송 및 언론 초청
국내 언론홍보	• 조달청의 해외 원조협력 사업 타당성과 기대성과 및 한국형 전자조달 수출사례에 대한 언론 자료 작성 및 배포
홍보 영상물 제작	• 전자조달 추진 경과, 기대효과, 타당성 및 한국정부의 협력 사항을 주제로 홍보 영상물 제작 • 영상물 CD 제작 및 주요 사이트에 영상물 게재
배너/플래시 광고	• 주요 정부 사이트에 배너 광고 • 조달학회, 기업사이트에 배너 광고
브로셔/팜플렛	• 브로셔, 팜플렛, 리플렛 등을 제작하여 이해하기 쉬운 전자조달 홍보물 작성 • 유관기관 민원실 비치 및 각종 행사 시 배포
정기 이벤트	• 전자조달 사용 우수기관 포상 • 전자조달 포털 및 홍보 웹사이트를 통해 이벤트 실시

※ 홍보추진 세부방안은 수원기관과 협력하여 진행함


사업수행 단계별 홍보 추진전략

구분	1단계(사업초기)	2단계(사업중기)	3단계(사업종료)
시점	• 사업초기 • 현지/국내 착수보고회	• 착수이후 시스템 설치 전 • 중간보고회, 단계별 워크샵	• 설치완료 후 인수인수계 • 개통식, 교육행사, 종료보고회
홍보 내용	• 사업추진계획 • 사업추진 당위성 및 기대효과	• 단계별 수행결과 • 서비스 개통계획 및 예상 효과	• 시스템 구축결과 개선사항 • 각 기관별 이용현황 및 개선효과 • 향후 이용확장 및 발전계획
주요 홍보 대상	• 주요의사결정권자 • 공공조달정책입안자 • 공공조달 이해관계자 • 일반국민	• 공공조달 실무자 • 각 조달기관장 및 정책담당자	• 대국민 • 공공조달 실무자 • 공공조달 이해관계자
주요 홍보 방안	• 현지언론, 방송사 활용 보고 사업착수 보도 • 1차 이용예정기관 내 사업홍보 배너 설치	• 고위급 인사 보고/인터뷰 결과 배포(방송사, 각 기관 홈페이지) • 워크샵 자료 배포 • 사업홍보물(행사 기념품) 배포	• 현지언론, 방송사 활용 행사 보도 • 서비스 이용자 인터뷰 결과 배포 (전자조달 포털 및 각 이용기관 홈페이지) • 홍보동영상, 브로셔 배포 • 사업홍보물(행사 기념품) 배포

가. 산출물 관리 체계

제안사는 사업수행과정에서 작성되는 문서는 문서관리 절차와 기준에 따라 관리하며, 형상관리와 문서협업 시스템을 통해 문서 기반의 의사소통이 가능한 문서관리체계를 운영합니다.

산출물 관리방안

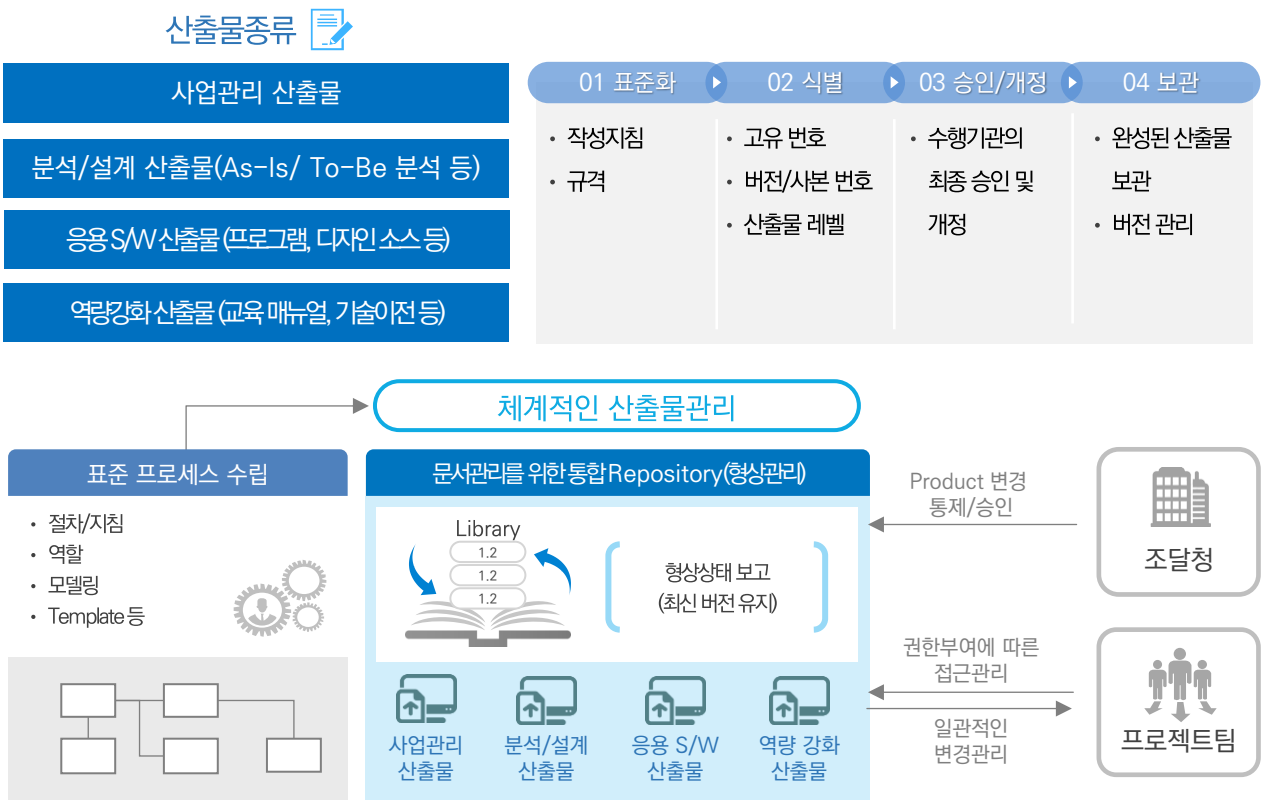

시스템 유지보수 및 운영지원	사용자 교육 및 기술이전	프로젝트 산출물관리 및 활용
• 프로젝트 수행 중에 발생된 변경내역 및 개선사항을 체계적으로 문서화하여 유지보수 및 운영지원 업무에 활용 • 현행 산출물의 검토 및 보완을 통해 지속적인 업무시스템 개선의 효율성 증대	• 프로젝트 산출물의 통합 저장소(Repository)에 체계적으로 축적하고, 지속적인 보완을 통해 사용자에게 변경 및 추가사항에 대해 적시에 이전함	• 작업단위 별로 생산되는 산출물은 업무 별 작업 일정계획과 품질보증계획과 연계하여 해당 산출물 작성여부와 QAO 검토 및 감리결과 반영, 고객 검토/승인을 받아 산출물의 품질을 제고함 • 축적된 분석/설계 산출물은 향후 해외 추진 프로젝트에 활용하여 효율적인 프로젝트 수행이 가능토록 함

나. 공정별 산출물 내역(1/4)

제안사는 사업추진 일정계획을 KSMP 관리방법론상의 품질보증 시점과 연계하여 프로젝트 산출물(사업산출물, 보조산출물, 관리문서)을 효율적으로 관리합니다.

사업 산출물 내역

단계		시기	보고내용	보고방법	보고주체	보고대상	보고 빈도
사업착수		착수후 15일 이내	착수보고(국내)	착수보고회	수행사	조달청	1회
		착수후 1개월 이내	착수보고(현지)	Kict-off 미팅	수행사	조달청 재무부, 조달청(DPP)	1회
		착수후 3개월 이내	과업 수행방향 및 수원국 니즈 분석결과	워크숍(1차)	수행사	조달청 재무부, 조달청(DPP)	1회
사업수행	마스터 플랜	(1차)착수후 3개월 이내	중간보고서	중간보고서	수행사	조달청 재무부, 조달청(DPP)	1회
		(2차)착수후 6개월 이내	컨설팅 결과 보고	워크숍(2차)			
	기자재	착수후 1개월 이내	설치 및	완료보고서	수행사	재무부, 조달청(DPP)	1회
		종료전 6개월 이내	기자재 설치	완료보고서	수행사	재무부, 조달청(DPP)	1회
	공공전자조달시스템	착수후 5개월 이내	분설설계보고	워크숍(2차)	수행사	재무부, 조달청(DPP)	1회
		착수후 7개월 이내	전자조달시스템 중간보고	워크숍(3차)	수행사	재무부, 조달청(DPP)	1회
		종료전 1개월 이내	전자조달시스템 개발완료 보고	워크숍(4차)	수행사	재무부, 조달청(DPP)	1회
	역량강화	종료후 1개월 내	초청연수(관리자) 결과 보고	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	2회
		종료후 1개월 내	초청연수(실무자) 결과 보고	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	2회
		종료후 1개월 내	시스템 운영 및 관리 교육 성과	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	2회
		종료후 1개월 내	기자재 운영 및 관리 교육 성과	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	2회
		종료후 1개월 내	유관기관 사용자 교육	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	3회
		종료후 1개월 내	강사양성 교육	서면(보고서)	수행사	조달청(PPS)	3회
사업완료		완료전 2개월 내	최종 성과 보고(국내)	최종보고회	수행사	조달청(PPS)	1회
		완료전 1개월 내	최종	최종보고회	수행사	조달청 재무부, 조달청(DPP)	1회

나. 공정별 산출물 내역(2/4)

제안사는 사업추진 일정계획을 KSMP 관리방법론상의 품질보증 시점과 연계하여 프로젝트 산출물(사업산출물, 보조산출물, 관리문서)을 효율적으로 관리합니다.

보조 산출물 내역(1/2)

사업 산출물	보조산출물명 (식별번호, 산출물명)	형태	제출방식	언어	생산시점	수량
전자조달 시스템 구축 및 운용 보고서	시스템 개발 중간보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	분석설계 완료 후 1개월 이내	1부
	요구사항 정의서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 3개월 이내	1부
	아키텍처 정의서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 3개월 이내	1부
	화면 표준 인터페이스 정의서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 3개월 이내	1부
	화면설계서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 6개월 이내	1부
	업무흐름도	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 6개월 이내	1부
	연계 인터페이스 정의서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 6개월 이내	1부
	API 메시지 정의서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	개발 착수 후 6개월 이내	1부
	단위/통합테스트 시나리오,. 케이스 및 결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문,러시아어	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	개발소스 코드	개발언어 소스코드	전자문서	영문/ 러시아어	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	소스코드 보안취약점 진단결과 및 조치 보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	서버 취약점 진단결과 및 조치보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	성능테스트 결과 보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	DB 설계서(ERD/테이블/컬럼 논리, 물리 정의서)	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문	시운전 개시 전 3개월 이내	1부
	개발완료보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 후 1개월 이내	1부
	시운전계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	품질보증계획서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	시스템설치계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	운영관리계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	하자조치계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	소스코드보안취약점진단조사계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	시범서비스운영계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	운영유지관리계획/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	사용자매뉴얼	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내 하드카피 100부	1부
	운영자매뉴얼	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내 하드 카피 100부	1부
	강사용 교재	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문,러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부
	동영상 교재	동영상 파일	USB Flash 메모리	러시아어	시운전 개시 전 1개월 이내	1부 (USB 3부)
	초청연수 과정개요서, 교육계획서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문	설치 후 1개월 이내	1부

나. 공정별 산출물 내역(3/4)

제안사는 사업추진 일정계획을 KSMP 관리방법론상의 품질보증 시점과 연계하여 프로젝트 산출물(사업산출물, 보조산출물, 관리문서)을 효율적으로 관리합니다.

보조 산출물 내역(2/2)

사업 산출물	보조산출물명 (식별번호, 산출물명)	형태	제출방식	언어	생산시점	수량
역량강화 및 인식개선 보고서	초청연수 견학계획서, 견학결과보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국/영문	설치 후 1개월 이내	1부
	홍보 동영상	동영상 파일	전자문서	영문/러시아어	설치 후 1개월 이내	1부
	홍보 브로셔	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문/러시아어	설치 후 1개월 이내	1부
기자재 공급	기자재 공급 계획서		전자문서	국/영문	설치 후 1개월 이내	1부
	전략물자판정서(필요시 전략물자 수출 허가서 포함)	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	선적전 1개월 이내	1부
	수출신고 서류	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	선적전 1개월 이내	1부
	기자재 설치 계획서/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	선적전/후 1개월 이내	1부
	파견 계획서/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문/영문 러시아어	파견전/후 1개월 이내	1부
	교육 계획서/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문/영문 러시아어	교육전/후 1개월 이내	1부
	기자재 테스트 /결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문/영문 러시아어	시험전/후 1개월 이내	1부
	운영교육 완료확인서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문/영문 러시아어	교육전/후 1개월 이내	1부
	기자재 설치 완료확인서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문/영문 러시아어	설치전/후 1개월 이내	1부
	파견 결과보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	파견 후 1개월 이내	1부
	교육 결과보고서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	국문	교육 후 1개월 이내	1부
	기자재별 설명서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문/ 러시아어	설치전 1개월 이내	1부
	퀵가이드북	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문/러시아어	설치 후 1개월 이내	1부
	통합 운영 설명서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문/러시아어	통합 시험전/후 1개월 이내	1부
	기자재 유지관리 계획서/결과서	한글 문서 혹은 MS Office 문서	전자문서	영문/러시아어	유지관리 전/후 1개월 이내	1부

나. 공정별 산출물 내역(4/4)

제안사는 사업추진 일정계획을 KSMP 관리방법론상의 품질보증 시점과 연계하여 프로젝트 산출물(사업산출물, 보조산출물, 관리문서)을 효율적으로 관리합니다.

관리문서

구분	산출물	제출 시점	제출 방식	언어	부수
전문가 파견	전문가파견계획서	파견 2주 전	서면/온라인	국문	1부
	전문가파견결과서	파견 완료 후 3주 이내	서면/온라인	국문	1부
사업 관리 및 기타	사업수행계획서	계약 체결 전	서면/온라인	국문	1부
	착수 보고서	계약 체결 후 1개월 이내	서면/온라인	국문	1부
	성과관리 계획서	계약 체결 후 1개월 이내	서면/온라인	국문	1부
	기초선조사 보고서	조사 이후 1개월 이내	서면/온라인	국문	1부
	중간선조사 보고서	조사 이후 1개월 이내	서면/온라인	국문	1부
	종료선조사 및 성과관리 결과 보고서	조사 이후 1개월 이내	서면/온라인	국문	1부
	연차점검 보고서	당해년 종료 1개월 전	서면/온라인	국문	1부
	최종 보고서	종료 2주 후	서면/온라인	국문	5부
	전자조달 직접수출 성과 백서, 가이드 매뉴얼, 나라장터 수출 모델/프레임워크/플랫폼 구축 가이드 등	종료 2주 후	서면/온라인	국문	1부

* 기타 주요 보고 일정 및 최종 산출물 목록, 부수, 양식 등은 조달청과 상의하여 결정
** 산출물 작성 언어는 수원기관과 협의하여 선택

3. 과업현지화 전략

3-1. 개요

제안사는 키르기스스탄의 특성을 반영하여 본 사업의 산출물이 공공조달 실무에 지속적으로 활용되고, 시스템 이용이 확산될 수 있도록 현지화 전략을 충실히 적용하여 사업을 수행합니다.

과업 현지화 전략

수원기관의 정보화 및 운영 계획/역량 반영	현지 ICT 인프라 구축 또는 유지보수 경험 인력 참여	유사환경국가의 전자조달 또는 전자정부 사업 유경험 전문가 투입	수원기관 뿐만 아니라 시스템 이용예정기관까지 사업실무반(TFT) 참여

키르기스스탄 지역적, 경제, 사회적 특성을 고려한 지속가능한 현지화 수행전략 수립

	지속가능성 확보방안
공공전자조달 프로세스 정립 1. 유사환경 컨설팅 경험 인력 투입 2. 시스템 개발인력의 컨설팅 과업수행 참여	• 개정된 신 조달법, 시행령을 충족하는 공공전자조달 프로세스 정립 및 조직개편방안 수립 • 전자조달 시스템의 핵심업무인 전자입찰 시스템 전문가의 BPR 참여로 컨설팅 결과와 시스템 기능의 일관성 확보
공공전자조달 시스템 구축 1. 수원기관 정보화 전략 반영 2. 사용자 수용성 제고 3. 수원국 인프라 활용 4. 현지기업 참여	• 용역, 물품, 서비스 등 키르기스스탄 공공조달 특성을 고려한 기능 개발 • 반복구매 업무의 효율화를 위한 Framework Agreement, 재고관리 시스템의 요구사항의 명확화 • 국가공인PKI, 재정정보시스템, 결제시스템 등 키르기스스탄 인프라 활용 시 해당 인프라 경험을 보유한 현지 IT기업의 참여로 독자 운영역량 확보
역량강화 1. 독자운영역량 배양을 최우선 순위로 반영 2. 현지인력을 통한 자체 역량강화 및 이용확산 추진	• 수원기관, 1차 시스템 이용예정기관의 실무자들로 사업추진전담반(TFT)를 구성하여 사업 全과정에 참여하여 자연스러운 기술이전 및 독자운영역량 배양 • 수원기관의 요구를 반영한 초청연수 및 현지교육 시행 • 초청연수는 공공전자조달 서비스 지속 이용 및 시스템 운영역량 강화에 초점을 맞춰 교육 프로그램 제공

3. 과업현지화 전략

3-2. 세부 현지화 전략

제안사는 최적화된 현지 서비스 제공을 위해 현지의 이해관계자들과 사업추진전담반을 구성하고 현지 전문기업과 인력을 활용하여 안정적인 현지화 목표달성과 기술이전을 보장합니다.

과업 현지화 전략

키르기스스탄 국가조달청과 사업추진전담반 구성

МСАД
МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ДЕПАРТАМЕНТИ

- 재무부, 조달청, 인포시스템즈(현 유지보수 기관) 등 이해관계자간 사업 추진전담반 구성
- 사업실무 협의, 의사결정, 대외협력을 위한 정기 실무협의체로 운영

- 이해관계자 협의체를 통한 의사결정, 범위관리
- 현지전문가를 통한 국가인프라 적용 및 유지보수
- 4개국어에 능통한 현지인을 활용한 원활한 소통

키르기스스탄 현지기업과 전략적 파트너쉽 구축으로 성공적인 현지화 및 기술이전 체계 마련




현지IT기업 MOCRORET와
MOU체결 (2025.05.20)



현지 인테리어 기업 Progress Story와
MOU체결 (2025.05.20)

현지 현업 전문가와 커뮤니케이션 전문가 섭외



- 현지법인 C&I Systems 법인장
- 前키르기스탄외교부외교관, UN변호사
- 프로젝트 현지자문관으로참여
  -협력기관, 협력국관계기관관계자
- KOICA 프로젝트 현지 책임자 수행중
- 한국어(하), 러시아어, 카르기스어, 영어

제안사의 협력사인 CNITech의 현지법인
C&I Systems와 전략적 사업 준비 중



- Project Management Consultant
- 통/번역사(고려대 경제학석사)
- 비슈케인문대학교 한국어과 전임강사
- 키르기스스탄 디지털정부 및 다수의 대한민국 프로젝트 참여
- 한국어, 러시아어, 영어 능통 현지인

현지 통역사 및 코디네이터로 참여 예정
