1. 품질보증

1-1. 품질보증 목표 및 전략

키르기스스탄 전자조달 시스템의 최고 품질수준 달성을 위해 실용성이 입증된 KSMP 사업관리 방법론의 품질관리 체계를 적용합니다. 또한 프로젝트/전사 이원 품질관리 체계 운영으로 일관된 품질 보증활동을 수행합니다.

* KSMP : KTNET Standard Management Process, KTNET 표준프로젝트관리방법론

일관된 품질보증활동 전략

키르기스스탄 전자조달 시스템 구축을 위한

‘ 고객 요구사항에 부합하는 최고 수준의 품질 ’

품질보증 전략

전사 품질보증 활동 수행	프로젝트 품질활동 실시	일관성 유지	종합적인 품질보증 수행	고유 개발 방법론 적용
• 제안사의 전사 품질보증 조직을 활용한 품질점검, 성능/DB튜닝 등 보증 활동 수행	• 프로젝트의 품질관리 계획을 수립한 체계적인 품질 활동 수행	• 단계별 일관성 있는 품질 업무 수행 • 일관된 품질의 산출물 보장	• 착수부터 유지보수까지 종합적인 품질보증 수행	• 사업에서 실효성이 입증된 방법론 적용에 의한 품질보증


고려사항	전략수립방향	도출전략
• 전사적 품질관리지원조직 필요 • 체계적인 품질관리계획 수립 • 내/외부 전문가를 통한 품질관리 • 사업수행 이후의 품질관리 정책 • 체계적이고 검증된 품질관리 지원 툴 필요 • 체계적인 진도관리 및 변경관리	• 품질관리 전문가 지원 • 제안사의 품질관리 방법론을 바탕으로 체계적인 품질보증 활동 수행 • 전사 품질관리지원조직 활용 • 사후 품질보증 지원활동 수행 • 품질관리교육을 통한 팀원 공유	• QAO(Quality Assurance Officer) 주관의 품질관리 • 제안사의 품질관리 프로세스 준수 • 전사 품질지원조직의 적극적인 활용(품질점검, 테스트 지원, 제품검사)

1. 품질보증

1-2. 품질보증 조직 체계

품질보증 활동은 표준관리, 품질교육 관리, 품질보증 관리, 품질감사, 형상관리, 품질보증 지원 등의 활동을 수행합니다. 제안사는 풍부한 경험을 바탕으로 사업수행 단계별 세부체계화 역할 정의를 통해 효과적인 품질보증 활동을 수행합니다.

사업수행 단계별 품질보증 조직 활동

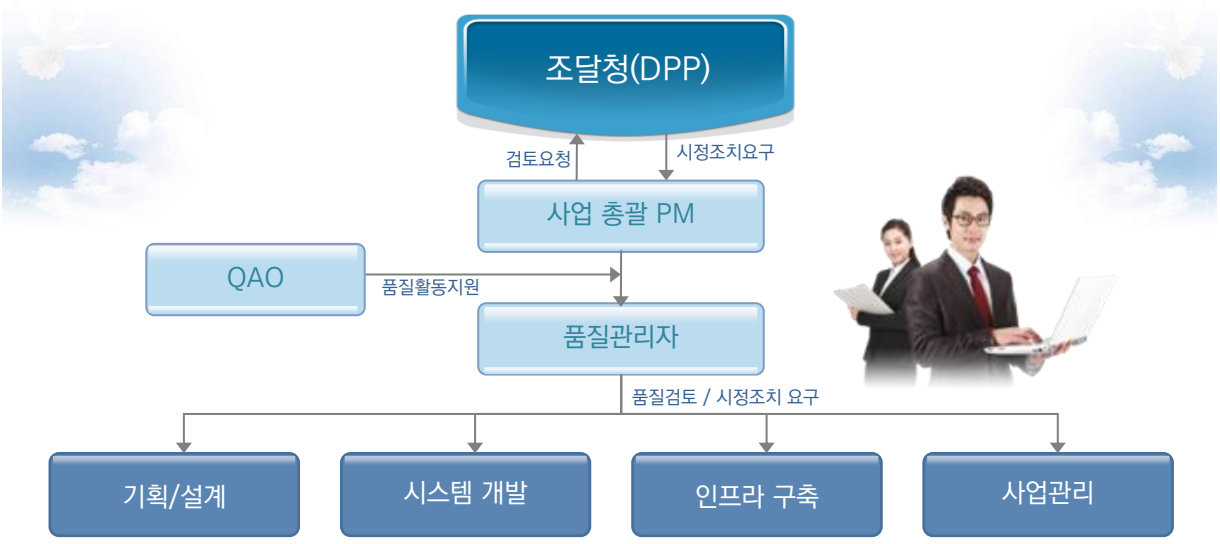

조달청 역할
- 주관기관 품질활동 계획 및 실시
- 사업자 품질보증 활동 점검 및 통제

사업관리자 역할
- 품질보증 계획 및 검토 및 시정조치 결과확인 및 승인
- 사업 전체일정 및 진도확인

품질관리자 역할
- 품질보증 활동 실시
- 사업팀별 의견조정 및 업무 협의사항 결정
- 시스템 개발 전반적인 품질향상을 위한 업무 수행

본사 지원조직 역할
- 사업 품질진단 및 품질평가, 품질보증 지원
- 단계별 품질심사 및 내부심사 실시

품질보증


품질보증 지원	▪품질평가 지침 작성 및 관리 ▪품질보증회의 실시 및 결과 반영	품질보증 관리	▪사업 팀원 품질교육 실시 ▪사업 팀원 품질교육 관리
형상관리	▪사업 산출물 형상관리 ▪변경관리	품질교육 관리	▪사업 팀원 품질교육 주관 ▪품질교육 현황관리
품질감사	▪수행팀 품질감사지침 수립 ▪수행팀 품질감사 및 결과 감독	표준관리	▪각종문서 및 양식, 지침 표준관리 ▪산출물 표준 준수 여부 관리

1. 품질보증

1-3. 품질보증 절차 및 내용

제안사의 품질관리는 이원 체계로 운영되며, 품질확보 활동기간에는 품질의 계획,요건 및 목표를 정의하고 프로젝트 기간 동안 지속적인 품질관리를 시행합니다. 또한 종료 이후에는 결과를 검토하여 피드백 및 수정과 협의과정을 거쳐 우수한 품질의 최종 산출물을 제출합니다.

주요 품질 관리 프로세스

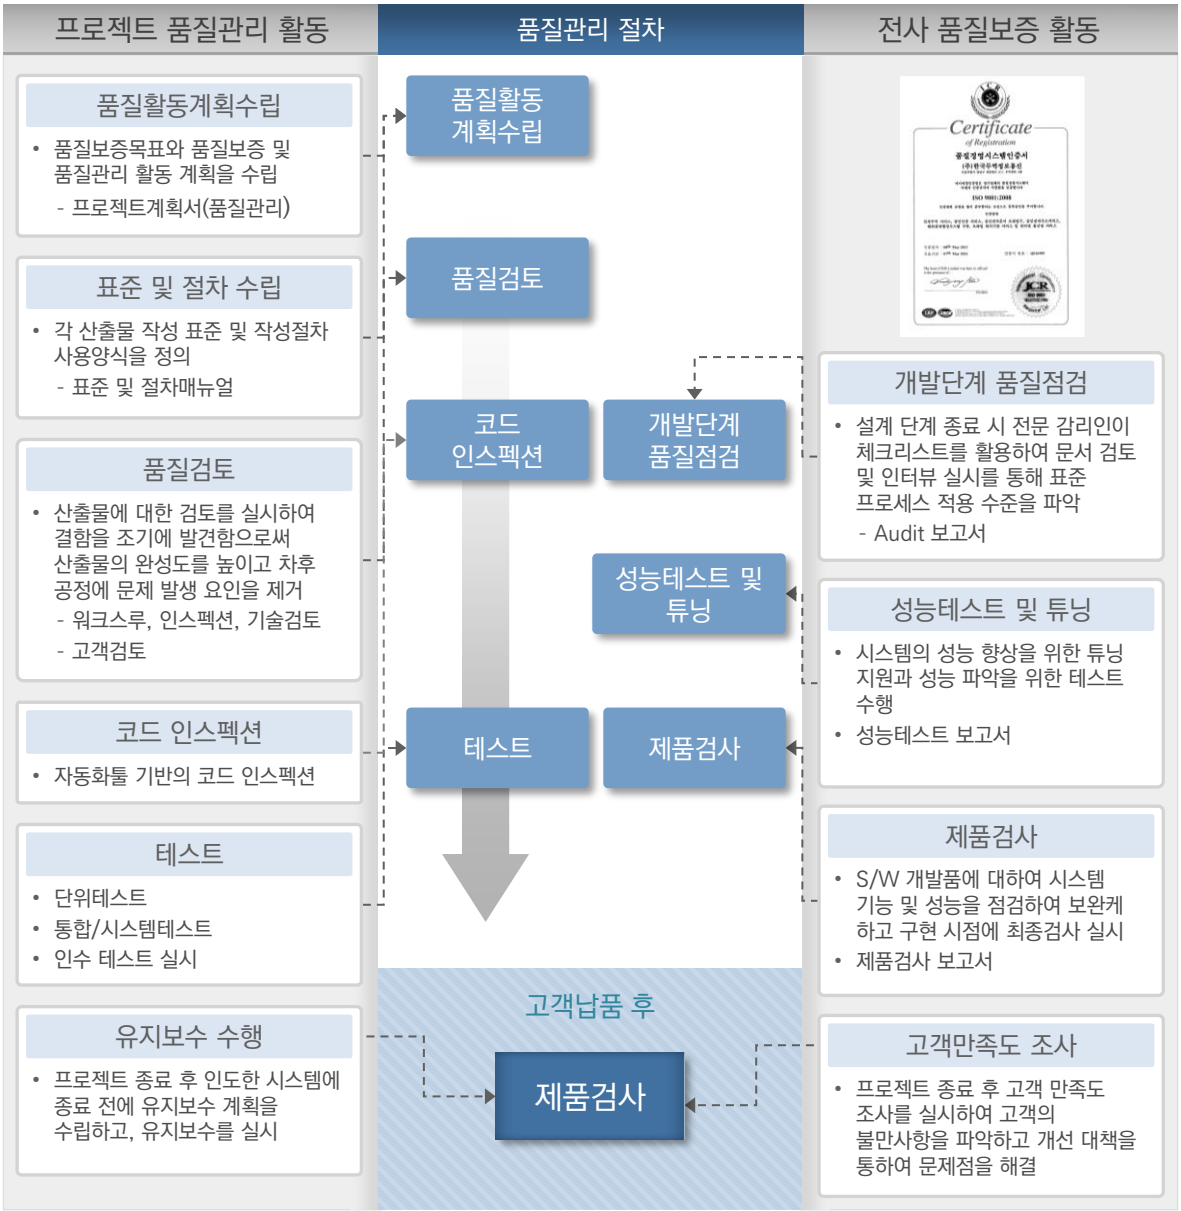

※ 상기 공정 산출물은 고객사와 협의를 통해 변경 될 수 있으며 공정진행상 필요한 Working 산출물임

2. 시험운영 ▶ 2-1. 시험운영 및 안정화 방안

2-1-1. 시험운영 및 운영안정화 단계별 절차

제안사는 타국가 나라장터 시스템 구축사업 경험에 기반하여 시험운영 단계부터 수원기관 운영조직과 함께 공동운영을 통해 수원기관이 시스템 독자적으로 안정적인 운영기반을 구축할 수 있도록 자연스러운 기술이전과 인수인계를 진행 합니다.

시험운영 및 안정화지원 방안

시험운영, 공동운영을 통한 독자 운영 역량 배양

분야별 전문인력 투입

- ❖ 각 시스템별 특징을 고려한 분야별 전문가 그룹
  - 시스템 개발 분야
  - 하드웨어/소프트웨어 구축 분야
  - 시스템 최적화 분야

시험운영부터 공동운영

- ❖ 각 시스템별 특징을 고려한 분야별 전문가 그룹 운영
  - 기능검증 및 성능측정
  - 통합운영 환경 연계 지원
- ❖ 시스템 운영 경험과 노하우가 바탕이 된 분야별 점검지표 활용

사전 위험 대응 관리

- ❖ 사전 위험요소 파악으로 비상상황의 신속한 대응 조치
- ❖ 분야별 비상 복구 체계 준비
  - HW 시스템
  - SW 및 어플리케이션

검증된 경험에 기반한 안정화 지원

안정적인 시스템 운영	❖ 시스템 인수인계 • 운영프로세스 최적화 • 기술지원 및 교육 • 지속적 기술지원	• 지속적 운영 안정화 지원 및 장애 조치활동 • 지속적인 교육 진행 및 인수인계 완료
시스템 인수인계 서비스 안정화	❖ 시스템 인수인계 • 성능 지표 진단 및 검증 ❖ 시스템 인수인계 계획 시행	• 시스템 설치 전후 성능지표 진단 및 검증을 통한 서비스의 연속성 및 신뢰성 확보 • 분야별 전문가로 구성된 기술지원 조직 운영
시험 운영 개시	❖ 실 운영 적용 후 서비스 기능 점검 • 분야별 기능 점검 및 보완	• 실 운영 적용 후 서비스 정상화를 위한 분야별 점검 • 실 운영 적용 완료 확인 (사업자, 발주처)

2-1-2. 시험운영 및 운영안정화 단계별 수행방안

제안사는 시험운영 기간 동한 서비스 오픈을 위해 주요기능을 점검절차에 따라 신속히 점검/보완 하여 키르기스스탄 전자조달 시스템의 조기 안정화를 구현 합니다. 특히 시험운영 단계부터 수원기관 운영자와 함께 공동운영을 통해 자연스러운 기술이전과 운영역량을 배양하도록 지원 합니다.

서비스 개시 방안



중점 고려사항

구 분	내용
본 운영을 위한 실제적 시범운영 계획 수립	• 공공조달 실무자 (수요기관 및 조달기업의 실제 사용자)가 참여하는 시범운영 계획 수립 • 2분기 이상 본 운영을 대비하여 과거 실제 업무자료를 활용한 시범운영 실시
체계적인 운영절차 확립	• 실질적 업무처리지침서 및 운영 매뉴얼 개발 및 적용 • 시스템 장애 및 상태 정보를 통합 관리하여 효율적으로 오류발생 또는 장애 상황에 대처
기술지원 체계 수립	• 정기점검에 의한 사전 장애 예방 활동 강화 • 고객 운영조직의 운영지원 • 수원기관 운영자와 함께 공동운영을 통한 자연스러운 기술이전 지원

3. 교육훈련

3-1. 국내초청 연수 개요 및 목적

제안사는 키르기스스탄 공공전자조달시스템의 지속적인 활용 및 운영을 위하여 관리자와 실무자를 초청하여 조달시스템 정책 및 사례연구와 시스템 운영, 관리, 유지보수 교육을 실시합니다.

연수 개요 및 목적

'키르기스스탄 전자조달시스템 운영 및 관리 역량 강화'



관리자 과정

- 인원 및 기간 : 8명 / 8일
  - 키르기스스탄 공공전자조달 관련 부처 국장급 이상 정책 책임자
- 대상자 선정 기준
  - 전자조달시스템 구축의 주요 의사 결정권자
  - 조달관련 업무 경험자
  - ICT관련 실무 경험이 풍부한자
- 연수 목적 : 키르기스스탄 공공전자조달 정책 역량 강화
  - 전자조달의 필요성과 도입 효과 이해
  - 선진 한국의 조달시스템 이해와 사례 연구
  - 연수 후 키르기스스탄 공공조달시스템 적용과 이용확산
- 연수 내용
  - 전자정부의 이해와 사례 연구
  - 전자조달 법제도
  - 전자조달시스템 운영 사례
  - 유관 기관 견학

실무자 과정

- 인원 및 기간 : 8명 / 8일
  - 키르기스스탄 공공전자조달 업무 및 시스템 운영 담당자
- 대상자 선정 기준
  - 전자조달시스템 운영 및 관리, 유지보수를 위한 운영 실무자
  - ICT관련 실무 경험이 풍부한자
- 연수 목적 : 키르기스스탄 공공전자조달 운영 역량 강화
  - 전자조달시스템의 운영 및 관리, 유지보수
  - 조달시스템 적용 및 운영방안 기술 습득
  - 제공 시스템과 기자재의 자체 운영 역량 강화
- 연수 내용
  - 전자조달시스템의 이해
  - 전자조달시스템 운영, 관리 및 유지보수 방안
  - 지원 기재재의 운영, 관리 및 유지보수 방안
  - 유관 기관 견학

분야별 전문가의 실무형 강의 및 컨설팅 제공

실무 역량 강화를 위한 유관기관견학

유사한 사업 연수 경험을 통한 안정적인 연수생 생활 지원

초청연수 구성

전자조달 정책 교육	시스템 운영 교육	유관기관 견학	한국문화체험
전자조달시스템 도입과 활용을 위한 정책 역량 강화	전자조달시스템의 운영 및 관리, 유지보수를 위한 기술 이전 교육	한국의 선진 전자조달시스템 운영현황 견학 및 운영 노하우 벤치마킹	한국에 대한 이해증진을 통해 양국의 우호협력 증진

3. 교육훈련

3-2. 중점 고려사항

교육훈련은 기획 시 사전조사 단계에서부터 사업책임자(PM)의 주도하에 수원기관의 합리적인 니즈를 적극 수렴하고, 체계적인 교육 커리큘럼을 기획하여 시스템 안정적 운영의 기반을 제공합니다.

중점 고려사항

'수원기관의 Needs를 적극 반영한 맞춤형 교육훈련을 통한 안정적 운영 기반마련'

과정별 차별화된 강의(워크샵)

- 관리자 초청연수
  - 나라장터 벤치마킹
  - 조달시스템 도입 시 고려사항, 운영 전략 등
- 실무자 초청연수
  - 전자정부 개요 및 전자조달 법/제도
  - 시스템 및 기자재의 운영 및 관리

발전성을 고려한 유관기관 견학

- 한국 나라장터 발전 및 타 국가 나라장터 도입 사례 연구
- 한국의 선진 전자조달 시스템 운영 사례를 벤치마킹 모델로 유관기관 견학 실시
  - 사업에 대한 이해도 증진
  - 전자조달 시스템의 발전방향 모색

현장중심의 실무교육

- 전자조달의 세계적 추세와 성공 사례 중심의 연수교육 진행
- 독자적인 시스템 운영 역량강화를 위한 실제 사업참여자들을 통한 실무형 강의를 통한 기술 이전

산업시찰과 문화체험

- 한국의 국가브랜드 이미지 제고 및 양국간의 우호협력 관계 강화
- 한국의 우수한 ICT 및 산업현장 견학
- 한국의 과거, 현재, 미래를 소개하는 문화체험 기회 제공

연수 중점 고려사항

- 연수생의 안전 및 생활 안정화
  연수생의 안전을 최우선으로 다수의 연수 수행 경험을 보유한 연수 전담자 배치, 사전 예약 및 연수 시뮬레이션을 통한 이동 및 연수생의 생활지원 체계 마련, 위험요소 파악과 제거
- 키르기스스탄 문화의 이해
  연수 대상 국가의 문화적 이해를 바탕으로 한 식사제공, 계절변화에 따른 건강관리, 연수전담자의 생활지원

3. 교육훈련

3-3. 추진전략

효과적인 교육훈련을 위하여 강의, 견학 등 맞춤형 커리큘럼을 구성하며, 특히 키르기스스탄 문화의 이해를 바탕으로 한국에서의 생활에 불편함이 없도록 수행합니다.

추진전략

'맞춤형 연수 커리큘럼 구성을 통한 체계적인 기술이전 연수 구성'

목적에 부합한 연수생 및 강사 선발

- 현재 또는 향후 조달시스템을 관리 및 운영 담당자로 연수생 선발
- 분야별 전문성 및 관련 해외사업 참여 경험을 보유한 강사선정

전 사업부문과 연계된 초청연수

- 전문가파견, 시스템 개발, 기자재 등 본 사업과 연관된 모든 부문과 연계하여 사업의 연속성을 유지함으로써 체계적인 기술이전 확립

벤치마킹 기관 및 시스템 운영 현장 견학

- 튀니지, 요르단, 이집트 전자조달 시스템 도입 경험 및 운영현황 벤치마킹
- 한국의 전자조달 관련 선진 시스템 경험 기회제공

안정적인 시스템 운영지원

- 전체 사업과의 연계성 및 일관성을 고려한 교육내용 및 연수일정
- 현지 시스템 설치에 맞춘 연수일정 및 집중 실습 교육을 통한 안정적 시스템 운영

맞춤형 연수 구성

이론 및 실습 강의	유관기관 견학	산업시찰	한국문화체험
연수생의 현업에 적용 가능한 실무중심의 교육 실시	이론으로 배운 지식을 견학을 통해 현장체험 기회 제공	한국의 발전된 산업현장을 체험하여 고국의 발전의욕 고취	한국에 대한 이해 증진을 통해 양국의 우호협력 증진

연수생 관리

사전준비를 통한 연수생 관리			
키르기스스탄 정서를 고려한 연수 환경	전자조달 사업 수행경험 전문 강사	실무 중심의 연수 교재	사업수행 전문가의 현장지원

3. 교육훈련

3-4. 추진방안

제안사는 다양한 초청연수 수행 경험과 노하우를 토대로 검증된 수행 프로세스를 구성하여 연수 계획수립에서 결과보고까지의 전 과정을 체계적으로 준비, 수행합니다.

추진방안

전자조달 시스템 적용 및 운영 실무 기술 습득

전자조달 시스템 운영 역량강화	튀니지, 요르단, 이집트 전자조달 시스템 구축사업 유경험 전문가에 의한 강의	세미나 및 토론을 통한 성공 노하우 전수 및 수요자 Needs 맞춤형 교육	지원 기자재 운용 전문성 배양	조달업무 표준화 및 전자화에 따른 업무 생산성 향상

수행사례 분석 → 계획수립 계획서 제출 → 조달청 승인 → 연수시행 → 평가 결과보고

교육장	강사	교재	커리큘럼	유관기관
• 제안사 IT 전문 교육장 • 유관기관 현장견학	• 해외 전자조달 시스템 사업참여 전문가 • 공공조달 전문가 • 전자정부 및 전자조달 전문가	• 이러닝 교재 제작 및 배포 (영어 및 키르기스어(혹은 러시아어) 지원)	• 분야별 전문지식 및 스킬 • 한국 조달청 제시 교육내용 • 키르기스스탄 요구사항 반영	• 전자정부 관련기관 • 주요 산업단지

초청연수 수행 특장점

튀니지, 요르단, 이집트 전자조달사업 수행 PM 참여	튀니지, 요르단, 이집트 전자조달 시스템 수행경험의 PM 참여로 효율적인 연수 수행 (타국가의 나라장터 도입사례 공유)
풍부한 연수초청 수행 경험	공공조달 초청연수 전문 수행기관에 연수 위탁 (조달청이 전자조달활성화특별법으로 지정한 전자조달지원센터에서 초청연수 수행)
연수 전 기간 러시아어 통역과 보조인력 배치	연수 전기간 전담 러시아어 통역을 배치 연수인원을 감안하여 연수전담자와 더불어 보조인력 연수 전기간 배치


3. 교육훈련

3-5. 연수생 선발 및 강사 구성방안

연수생은 키르기스스탄 전자조달 시스템을 운영 및 관리할 인재이므로 선발단계에서부터 연수생의 능력 및 향후 업무를 고려하여 선정하며, 강사는 사업참여자 중 관련 전문지식을 가진 자로 선발하여 연수의 효과를 극대화합니다.

연수생 및 강사 구성방안

연수생 선발 방안 및 절차

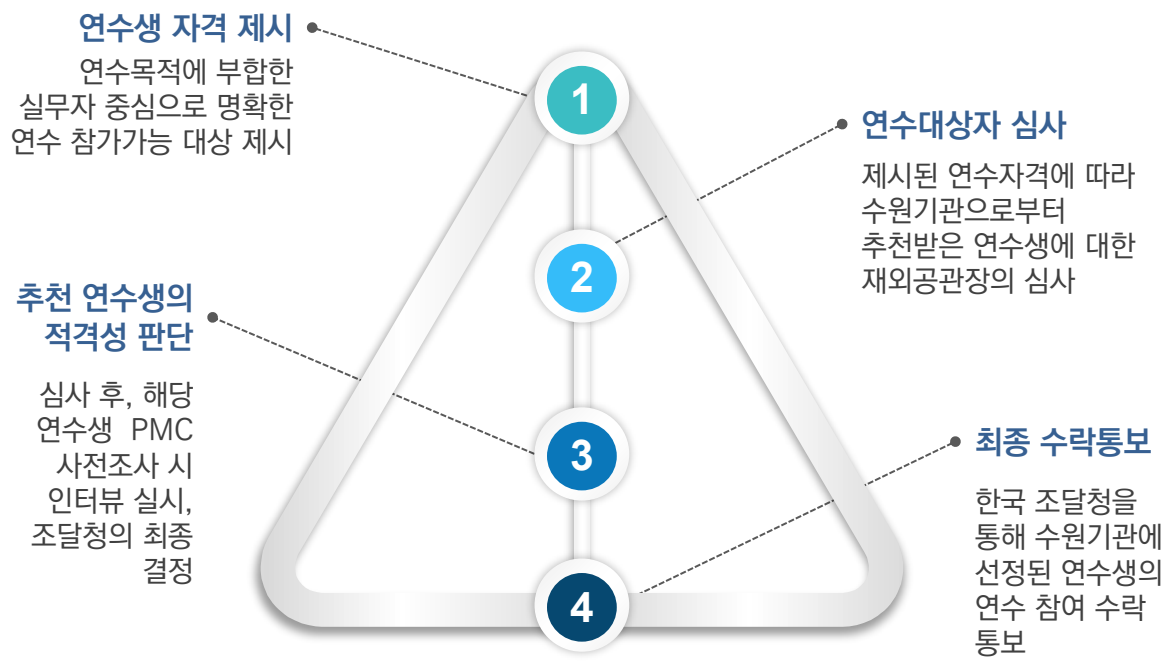

'최적의 연수생 및 강사 선발을 통한 교육훈련의 효과 극대화'

강사 선정 기준

전자조달분야 전문지식	본 사업 및 해외사업 이해	강사의 전문지식	기본조건
• 전자정부 및 ICT 관련 전문가 • 전자조달 시스템 전문가 • 특히 키르기스스탄 전자조달 시스템 참여 경험자를 우선 선발	• 해외사업에 참여한 경험과 본 사업 연수에 대한 이해가 높은 인력 • 장기적인 안목으로 향후 발전성에 대해 제시할 수 있는 역량을 지닌 인력	• 개발자에 의한 실무중심의 교육 • 전문가파견과 연계하여 기술이전의 연속성 유지	• 전문 분야 학위 보유 • 10년 이상 해당분야 경력 • 영어강의 가능 및 연수생과의 친화력

3. 교육훈련

3-6. 연수생 관리방안

한국에서의 연수기간 중 연수생의 문화, 종교적 특성을 고려하여 한국생활에 불편함이 없도록 체계적이고 세심한 관리를 합니다.

연수생 관리

'연수생 만족도 및 교육효과 향상을 위한 체계적인 연수관리'



- 제안사 전문 교육장
  - 숙소와의 거리 고려, 교육환경 조성 및 휴식공간 제공
  - 강의를 위한 강의 기자재 지원
  - 교육장 주변의 다양한 한국체험

전문 강의장



- 호텔
  - 편안한 휴식을 위한 단독룸 이용
  - 생활 및 업무지원 편의시설 구비
  - 교육장 및 견학 등 접근성 고려

숙소

- 국내초청연수 가이드라인을 준수한 여행자보험 가입 및 안전 당부
- 사전준비를 통한 안전문제 사전파악과 대응방안 마련
- 의료지원절차, 질병 및 비상시 대처요령 설명
  - 일기변화 및 위생에 적극적인 대처로 철저한 보건위생

안전 및 건강관리

- 일방적인 지식 전달식 강의가 아닌 컨설팅을 기초로 한 참여식 강의진행 및 과제제시와 점검실시
- 자유로운 토론 및 질의응답이 진행되도록 강의 진행, 강의실 교육 이후 관련 유관기관을 견학하여 연수교육의 이해 및 실무 적용역량 강화
- 현장 실무자 및 관련 전문가와의 면담 진행
- 실무자과정의 경우 지원되는 시스템에 대한 이해와 사용역량 강화를 위해 현지 설치와 초청연수 그리고 전문가파견과의 연계를 통한 교육효과 극대화

교육관리

- 러시아어 사용 환경 및 정보 접근성 지원(초기 안내 자료 제공, 러시아어 미디어/콘텐츠 접근 등)
- 요청 시 집단주의적 유대감 및 교류 기회 제공(그룹 활동 및 공동 식사 기회 마련, 멘토링 또는 버디 시스템 운영, 문화의 밤, 음식 교류 등)
- 연수전담자에 의한 사전 연수준비 및 환경적 위험요소 제거, 비상연락체계 구축
- 영어 의사소통이 가능한 전문 수행원 이외에 현지어 통역을 배치하여 원활한 연수생과의 의사소통 지원

러시아 문화권 생활지원 및 전문통역

3. 교육훈련

3-7. 관리자과정 수행 방안

제안사는 관리자들을 대상으로 공공조달시스템 도입에 대한 이해를 통해 사업에 대한 공감대를 형성하고, 한국의 유관기관 및 선진 조달시스템 운영의 벤치마킹을 통해 연수 후 전자조달시스템 정책을 수립하고, 사업 환경 조성을 지원하도록 합니다.

관리자과정 교육 및 일정

관리자 과정 주요 교육 내용

강의제목	주요내용	강사/소속	시간
전자정부 개요	• 전자정부와 전자조달의 관계 • 디지털 정부 혁신과 정책 방향	조규환 전무 / 이거브컨설팅	3H
전자조달 법/제도	• 전자조달 관련 법률 및 제도 체계 • 법적 근거에 따른 전자조달 절차 및 규정	김병건 본부장 / 조달연구원	3H
한국공공조달 현황	• 한국 공공조달의 특징 및 운영현황 • 전자조달 사업 추진이력 및 국제협력 사례	정진성 교수 / 조달교육원	3H
한국 전자조달 운영사례	• 나라장터 운영조직 및 절차 • 시스템 운영 실무 (장애대처, 분쟁 조정 사례)	김대성 서기관 / 조달청	3H
한국 전자조달 도입 사례 연구	• 조달청 및 유관기관의 시스템 전환 사례 • 도입 과정에서의 과제 및 해결방안	우종인 팀장 / 전자조달지원센터	3H

관리자 과정 연수일정

일차		구분	시간	내용	비고
1일차	일	입국 및 석식	17:00 – 19:00 19:00 –	• 입국 및 호텔 이동, 석식 • 짐정리 및 자유시간	
2일차	월	OT 한국문화체험	10:00 – 14:00 15:00 – 18:00	• OT 및 환영오찬 • 경복궁, 서울N타워	
3일차	화	강의 1 강의 2	10:00 – 13:00 14:30 – 17:30	• 전자정부 개요 • 전자조달 법/제도	
4일차	수	이동 유관기관 견학	10:00 – 12:00 13:30 – 16:30	• 대전 조달청 이동 • 조달청 콜센터 / 조달청 운영센터 견학	
5일차	목	강의 3 유관기관 견학 한국문화체험	10:00 – 13:00 15:00 – 16:30 16:30 – 18:00	• 한국공공조달 현황 • KTNET 데이터센터 견학 • COEX	
6일차	금	강의 4 강의 5	10:00 – 13:00 14:00 – 17:00 17:00 –	• 한국 전자조달 운영사례 • 한국 전자조달 도입 사례 연구 • 수료식, 환송만찬	
7일차	토	한국문화체험 한국문화체험 한국문화체험	10:00 – 11:30 13:00 – 15:30 15:30 –	• 남산한옥마을 • 명동 • 아이파크몰	
8일차	일	출국 준비 한국문화체험 3 한국문화체험 4	09:00 – 11:30 13:00 – 15:00 15:00 –	• 짐정리 및 호텔 체크아웃 • 인사동 • 공항이동, 출국수속, 출국	

※ 상기 일정 및 커리큘럼은 조달청 및 수원국의 요청에 따라 변동될 수도 있습니다.

3. 교육훈련

3-8. 실무자과정 수행 방안

제안사는 본 사업으로 구축되는 공공조달시스템의 원활한 운영 및 관리, 독자적인 유지보수를 위하여 분야별 실무자들을 대상으로 기술이전 교육을 실시합니다.

실무자 과정 교육 및 일정

실무자 과정 주요 교육 내용

강의제목	주요내용	강사/소속	시간
한국 공공조달 현황	• 한국 공공조달의 특징 및 운영현황 • 전자조달 사업 추진이력 및 국제협력 사례	김병건 본부장 / 조달연구원	3H
한국 전자조달 운영사례	• 나라장터 운영조직 및 절차 • 시스템 운영 실무 (장애대처, 분쟁 조정 사례)	김수동 부장 / KTNET	3H
전자조달 응용시스템 운영관리 기법 I	• 공공전자조달 응용시스템 구성 현황 • 전자정부 프레임워크 운영기술 • 응용시스템 개발, 유지보수 실습	최정원 팀장 / 큐아이브이	3H
전자조달 응용시스템 운영관리 기법 II	• DBMS, 서버, 네트워크 관리 실무 • 시스템 모니터링 툴 관리 실무	변진호 이사 / 카프이엔지	3H
전자조달 응용시스템 운영관리 기법 III	• PKI 이해 및 발전추이 • PKI 운영 실무 • 전자조달 보안/인증 적용 및 운영사례 연구	이상곤 팀장 / 큐아이브이	3H

실무자 과정 연수일정

일차		구분	시간	내용	비고
1일차	일	입국 및 석식	17:00 – 19:00 19:00 –	• 입국 및 호텔 이동, 석식 • 짐정리 및 자유시간	
2일차	월	OT 한국문화체험	10:00 – 14:00 15:00 – 18:00	• OT 및 환영오찬 • 경복궁, 서울N타워	
3일차	화	강의 1 강의 2	10:00 – 13:00 14:30 – 17:30	• 한국 공공조달 현황 • 한국 전자조달 운영사례	
4일차	수	이동 유관기관 견학	10:00 – 12:00 13:30 – 16:30	• 대전 조달청 이동 • 조달청 콜센터 / 조달청 운영센터 견학	
5일차	목	강의 3 유관기관 견학 한국문화체험	10:00 – 13:00 15:00 – 16:30 16:30 – 18:00	• 전자조달 응용시스템 운영관리 기법 I • KTNET 데이터센터 견학 • COEX	
6일차	금	강의 4 강의 5	10:00 – 13:00 14:00 – 17:00 17:00 –	• 전자조달 응용시스템 운영관리 기법 II • 전자조달 응용시스템 운영관리 기법 III • 수료식, 환송만찬	
7일차	토	한국문화체험 한국문화체험 한국문화체험	10:00 – 11:30 13:00 – 15:30 15:30 –	• 남산한옥마을 • 명동 • 아이파크몰	
8일차	일	출국 준비 한국문화체험 3 한국문화체험 4	09:00 – 11:30 13:00 – 15:00 15:00 –	• 짐정리 및 호텔 체크아웃 • 인사동 • 공항이동, 출국수속, 출국	

※ 상기 일정 및 커리큘럼은 조달청 및 수원국의 요청에 따라 변동될 수도 있습니다.

3. 교육훈련

3-9. 현지연수 수행 방안 (1/2)

제안사는 컨설팅, 시스템 개발 등 각 분야별 전문가파견과 연계하여 사업수행 全과정에 걸친 공동수행을 통해 수원국 관계자들의 역량강화와 기술전수를 수행합니다.

현지연수 계획 (1/2)

현지역량강화 중점추진목표

- 수원기관, 1차년도 이용예정기관 실무자를 중신으로 사업추진전담반을 구성, 사업초기부터 컨설팅, 요구분석, 시스템 설계, 테스트, 설치 등 사업 全공정에 참여하여 한국 전자조달 지식과 노하우 습득
- 전자조달 추진 사례, 법제도, 발전방향 등 향후 이용활성화 정책과 전략수립 역량 배양
- 수원국 강사들을 사업초기 단계에 선발하여 시스템 요구사항, 설계 과정 등 개발 이력 체득
- 개발완료 후 시스템 이용자 교육 뿐만 아니라 강사 양성까지 독자적으로 수행할 수 있는 역량 배양

현지연수 추진절차

구분	내용
역량강화 계획 사전 협의	• 현지 착수조사 시 현지 역량강화에 대한 범위와 일정, 장소, 교육대상자 선정 등을 협의 • 각 공정별 역량강화에 대한 수원국 준비사항 요청 (여성비율 30% 이상 요청) • 역량강화 추진에 대한 양국 역할과 책임을 정의하고 합의록 작성, 서명
공정별 맞춤형 역량강화 교육	• 사업수행 각 공정별 파견전문가들을 통해 사업추진 역량 전수 • 수원국 강사, 사업추진 전담반은 사업전체 공정에 참여하여 현황분석, 목표설계, 법제도 개선, 기능요건 수집, 시스템 설계, 테스트, 설치 등 全 과정 경험 • 시스템 이용 대상자를 담당업무, 역할별로 세분화하여 맞춤형 교육 실시 • 이러닝 교재 제작, 배포를 통해 자체, 반복 학습 지원 (영어, 키르기스어(혹은 러시아어) 지원)
모니터링과 평가	• 주입식 강의를 지양하고 분석, 설계, 토의, 의사결정 등 참여방식 교육 중심으로 진행 • 각 단계별 피드백을 통해 부족한 점과 보완사항 등 재학습 필요사항을 파악하고 추가 교육을 진행

현지연수 구성 요건

No	교육내용(횟수)	대상	시기	전문가
1	• 조달시스템 기본 교육 (2회)	조달청(DPP), 발주기관, 조달업체 등	분석단계, 개발중간	PM, 개발PL
2	• 조달시스템 운영 및 유지관리 교육 (6회)	조달청(DPP) 및 시스템 관리자	시범운영단계(2), 본 운영단계(4)	PM, 개발PL
3	• 기자재 운영 및 유지관리 교육 (2회)	기자재 운영자	설치 및 운영지원단계	기자재 전문가, 개발전문가
4	• 조달시스템 정부기관 사용자 교육 (2)	발주기관	개발완료 후, 시범운영단계	개발PL
5	• 조달시스템 조달업체 사용자 교육 (2)	조달업체		
6	• 콜센터 운영 및 유지관리 교육 (3회) • 조달시스템 사용자 교육을 위한 강사양성 교육 (2회)	시스템 운영자, 콜센터 상담원, 강사	설계단계, 개발완료 후, 시범운영단계	개발PL

3. 교육훈련

3-9. 현지연수 수행 방안 (2/2)

현지 역량강화 세부교육내용 구성방안

교육명	강사(담당업무)	세부 교육내용
조달시스템 기본 교육	송종인 (PM)	• 한국 전자조달 시스템 핵심 요소 및 특장점 • 주요 적용 기술
	배홍길 (개발PL)	• 키르기스스탄 전자조달 시스템 핵심요소 및 특장점
조달시스템 운영 및 유지관리 교육	송종인 (PM)	• 한국 전자조달시스템 운영 사례 및 발전과정 • 타 국가 전자조달 시스템 운영 사례
	정치영 (개발PL)	• 전자정부 프레임워크 활용기술 • 각 서브 시스템별 구성현황 • 전자조달 응용시스템 개발 실습
기자재 운영 및 유지관리 교육	최정원 (기자재PL)	• 키르기스스탄 전자조달 시스템 아키텍처 • 서버, 네트워크 장비 운영방법 • 가상화 구성내역 및 자원운용 방법
조달시스템 정부기관 사용자 교육	배홍길 (개발PL), 정치영 (개발PL), 심영수 (개발PL)	• 사용자 등록 절차 실습 • 입찰, 계약, 지급, 쇼핑몰, 카탈로그 시스템 사용방법 실습 • 전자캐비닛 시스템 사용방법 실습
조달시스템 조달업체 사용자 교육	배홍길 (개발PL), 정치영 (개발PL), 심영수 (개발PL)	• 사용자 등록 절차 실습 • 입찰, 계약, 지급, 쇼핑몰, 카탈로그 시스템 사용방법 실습
콜센터 운영 및 유지관리 교육	배홍길 (개발PL), 정치영 (개발PL), 심영수 (개발PL)	• 나라장터 콜센터 운영 사례 • 콜센타 상담시스템 사용방법 실습 • 각 업무시스템 사용방법 실습
조달시스템 사용자 교육을 위한 강사 양성 교육	배홍길 (개발PL), 정치영 (개발PL), 심영수 (개발PL)	• 각 업무 시스템 별 사용방법 실습

※ 세부 연수내용과 시기, 연수대상자는 수원기관과 협의하여 조정 가능함

4. 유지관리

4-1. 유지관리 개요

제안사는 유지관리 계획수립과 수행을 통해 문제발생 시 신속한 복구 뿐만 아니라 효과적인 예방정비를 수행하여 문제발생의 요소를 근원적으로 해결합니다. 또한 현지 유지관리 업체를 선정하여 문제점을 즉시 해결하여, 원격 장애처리를 지원 합니다.

유지관리 개요

안정적 시스템 운영의 **연속성 확보**

유지관리 전략

- 현지 유지관리 업체의 인력 조기투입을 통한 유지보수능력 배양
- 시스템 시범운영기간을 활용한 시스템 조기 안정화 지원
- 시스템 유지관리 및 운영지원 경험인력 중심의 유지관리 지원
- 하자보수 시 제반 기술사항 지원 및 긴밀한 연락체계 유지

시스템의 조기 안정화

원격지원이 불가능한 장애 발생 시 현지 대응

현지 기업을 통한 유지관리 지원

안정화를 위한 정기점검 및 현지 운영 대응 채널

원격 장애처리 지원

유지관리 기능	유지관리 분류	유지관리 범위
•장애해소 – 장애의 사전예방 – 장애발생시 신속대처 – 재난 복구 •유지관리 지원 – 유무상 지원 – 예방지원 – 운영자 교육	– 무상 유지관리 – 구축 시스템에서 발견된 자체결함 수정 ※ 시스템 인도 후 요구사항 변경 및 기능의 변화는 포함하지 않음 – 유상 유지관리 – 무상 보증기간이 만료된 이후의 모든 유지관리 행위 – 천재지변이나 운영자의 부주의 등의 무상유지보수 이외의 유지관리 – 유상 유지관리는 별도 계약에 의해 지원	• 제안범위에 속한 응용소프트웨어 및 하드웨어, 개표기 등 모든 기자재 – 응용소프트웨어 – 하드웨어(서버 등) – 소프트웨어 – 네트워크

4. 유지관리

4-2. 유지관리 대상 및 내용

제안사는 안정적인 유지관리를 위하여 유지관리 대상을 응용프로그램, 하드웨어 및 소프트웨어 기자재에 대한 기술지원으로 구분하여 원활한 시스템 운영을 보장합니다.

유지관리 대상 및 내용


구 분		내용
유지관리 대상		• 본 사업에서 개발/납품/설치되는 모든 응용프로그램과 하드웨어/ 소프트웨어, 기자재
유지관리 기간		• 개발된 시스템의 무상유지보수 기간은 현지검수 완료일로부터 24개월 • 납품된 기자재는 현지검수 완료 후 24개월(일부 하드웨어는 3년간)
유지관리 내용	하자보수	• 발견된 하자의 원인을 찾아 문제해결을 하는 경우로써 무상 보증기간에는 무상지원하며, 무상 보증기간 경과 후에는 유상지원함 • 하자 발생 시 문제의 유형을 파악 후 즉시 조치하고, 조치된 내용을 응용시스템 운영자에게 교육
	기능개선	• 새로운 기능을 추가하고 기존의 시스템을 개선하는 경우로써 유상제공을 원칙으로 하며, 상세사항은 추후 협의함
	환경적응	• 신규 운영체제, 혹은 신규 하드웨어 환경으로 이식하는 경우 유상으로 지원
	장애복구	• 시스템 운영 중 발생한 고장 및 장애 복구 기술지원 • 즉각적인 원인분석 및 복구 보장 • **현지 파트너쉽 기업을 통한 장애 대응 지원**
	예방점검	• 유지보수의 용이성을 높이거나 시스템의 신뢰성을 향상시키는 경우로써 무상 지원 • 예방점검과 이상 징후 발생 시 수시 예방정비 실시 • **현지 파트너쉽 기업을 통한 일정기간(협의 필요) 동안 정기점검 수행**
유지관리 대상	무상유지관리	• 시스템 제안내역과 공급시스템이 상이하거나 하자가 있는 경우 무상 하자보수 지원
	유상유지관리	• 무상 보증기간이 만료된 이후의 모든 유지보수 행위 • 유상 유지보수는 별도 계약에 의해 지원
	기타	• 원활한 유지보수 지원을 위한 비상연락체계 유지 • 제공한 솔루션이 요구조건을 충족할 수 없을 때 요구조건 충족 가능한 제품으로 무상교체 • 유상유지보수는 무상유지보수 완료 후 주관기관과 계약을 체결하여 실시 • 무상유지보수 기간 중이라 하더라도 현재 시스템의 기능 외에 새로운 기능, 요구사항의 발생 등 추가 요구사항에 대해서는 주관기관과 협의하여 결정 • 고객의 고의 또는 천재지변에 의한 장애에 대해서는 책임을 지지 아니함 • 유지보수 인력 이외의 인력이 수행한 시스템 개조, 첨가, 조정 및 수리로 시스템에 중대한 영향을 끼친 경우는 유상 처리함

4. 유지관리

4-3. 유지관리 조직

제안사는 하자보수 및 장애발생 시 신속히 대응하고 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 유지관리 조직을 구성, 제안사 기술지원 조직의 기술지원 및 현지 유지관리팀의 주기적인 점검을 통하여 운영시스템의 안정화에 최선을 다합니다.

유지관리 조직

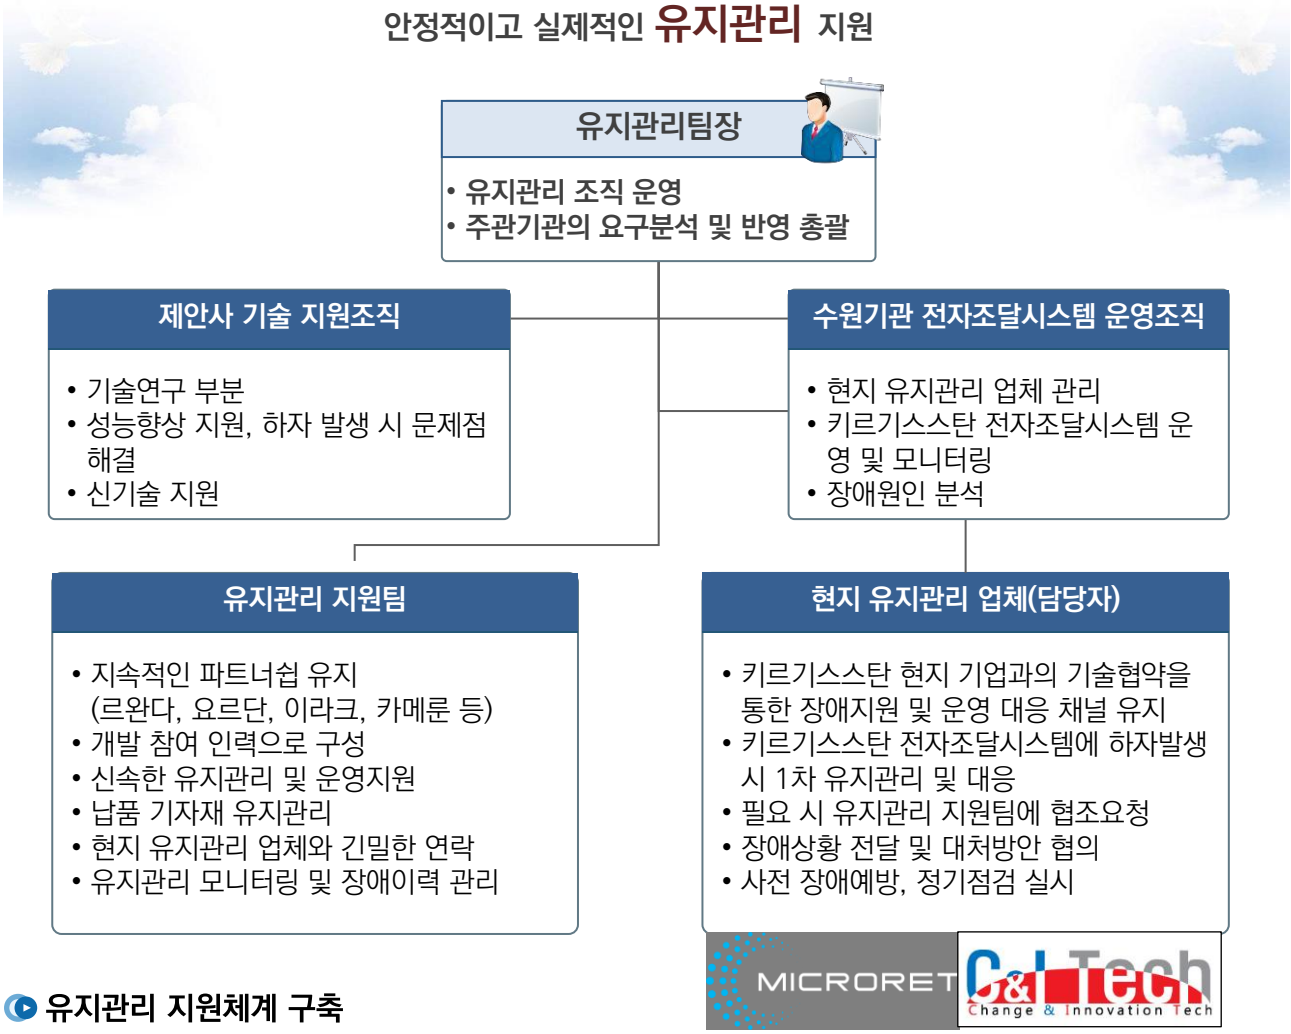

유지관리 지원체계 구축


- 해외사업 수행 시 제기되는 사업 종료 후 현지와의 사업 연속성 확보를 위하여 파트너쉽(기술협약)을 관계인 현지 기업을 통하여 안정적이고 실제적인 유지관리 지원
- 현지 유지관리 담당자를 설치 초기부터 참여시켜 유지관리 능력 배양
- 제안사 전담 유지관리 인원을 편성 운영 및 현지 유지관리 전문업체의 전담조직 구성
- 장애 발생 시 개발업체, S/W 및 H/W 공급업체의 기술지원창구를 활용하여 즉시 복구
- 전문기술자와 연락 가능한 비상연락망 체계 구축 및 인터넷을 통한 유지보수 수행

4. 유지관리

4-4. 유지관리 절차

제안사는 전사표준 유지관리 절차에 따라 효율적인 지원체제를 구축•지원하며, 이후 후속사업수행 시에도 지속적인 유지관리 체계를 유지합니다.

유지관리 절차

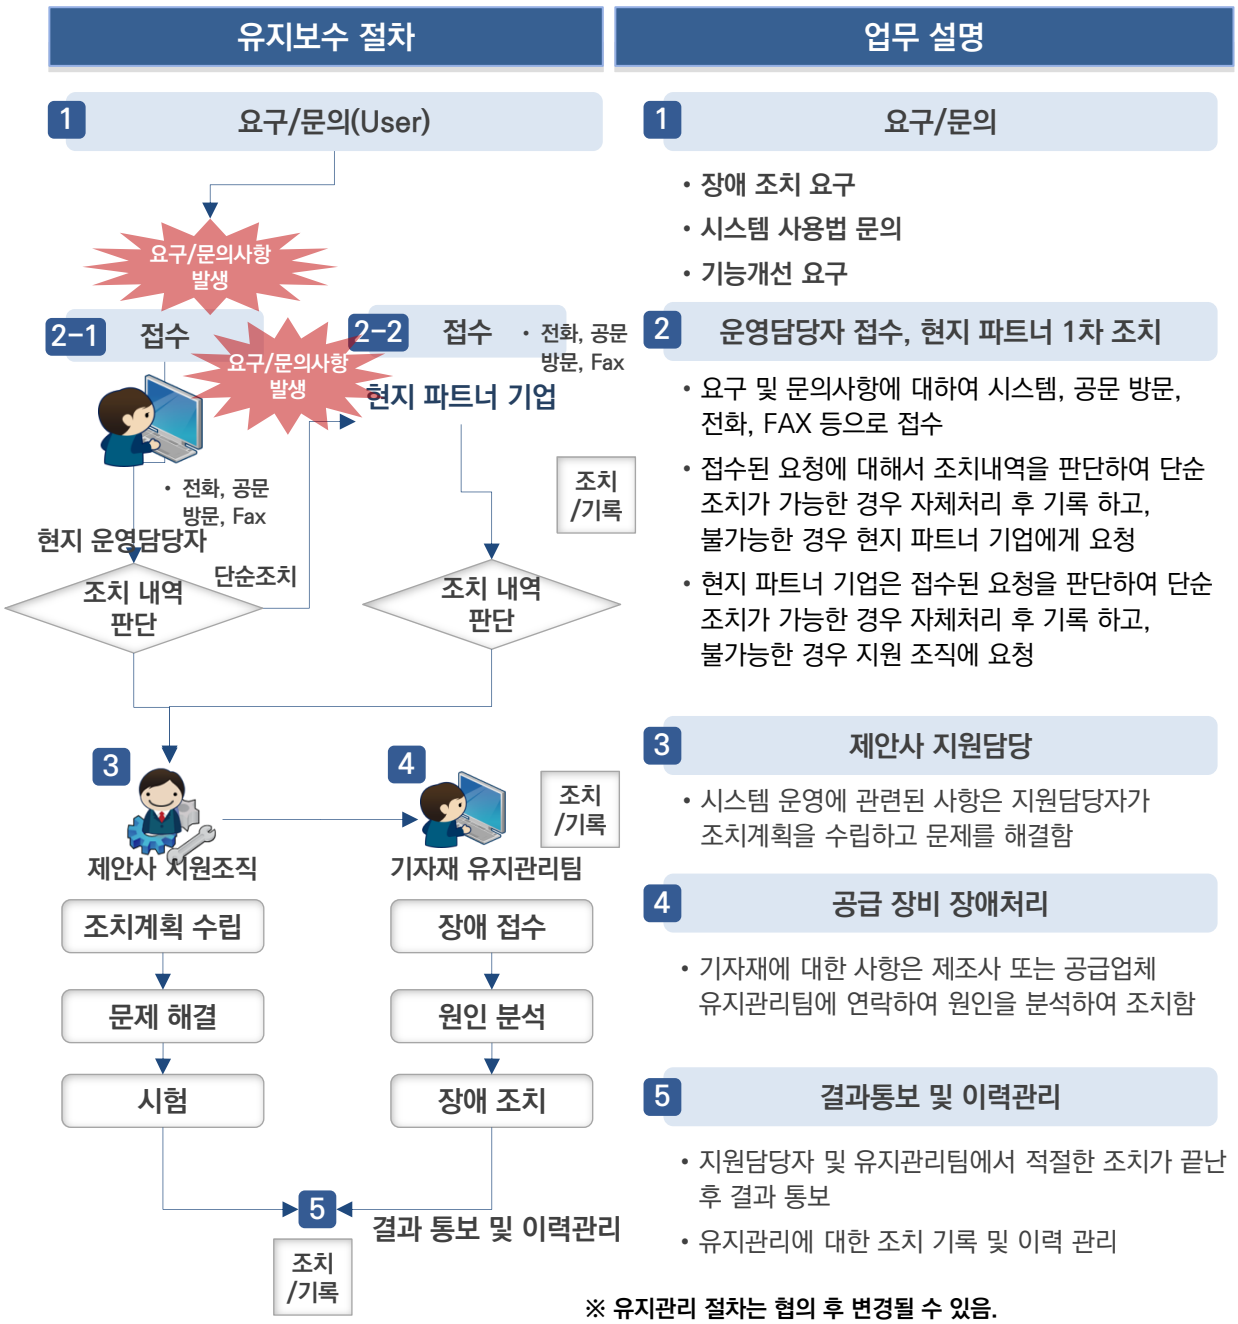

※ 유지관리 절차는 협의 후 변경될 수 있음.

※ 납품 기자재에 대해서 기자재 검수 후 1년간 유지관리 지원

5. 하자보수

5-1. 하자보수 개요

제안사는 문제발생 시 신속한 복구 뿐만 아니라 효과적인 예방정비를 수행하여 문제발생 요소를 근원적으로 해결합니다. 또한 한국과 키르기스스탄의 지리적 위치, 시스템 이해 부족으로 인한 문제발생 우려 등을 고려하여 현지 유지관리업체를 선정, 위급한 문제발생시 즉시 문제를 해결하고 인터넷을 통한 원격 장애처리를 지원함으로써 원활한 장애처리 및 하자보수 활동을 수행하겠습니다.

하자보수 개요



현지 유지보수 업체와의 사전 MOU 체결로

‘ 문재 발생시 신속한 장애처리 지원’

하자보수 전략

- 현지 유지관리업체의 인력 조기투입을 통한 유지관리능력 배양
- 시스템 시범운영기간을 활용한 시스템 조기 안정화 지원
- 시스템 유지관리 및 운영지원 경험인력 중심의 하자보수 지원
- 하자보수 시 제반 기술사항 지원 및 긴밀한 연락체계 유지

시스템의 조기 안정화

원격 장애처리 지원

하자보수 기능	하자보수와 유지보수 구분	하자보수 범위
• 장애해소 – 장애의 사전예방 – 장애발생시 신속대처 – 재난 복구 • 하자보수 지원 – 무상 지원 – 예방지원 – 운영자 교육	• 하자 보수 – 구축 시스템에서 발견된 자체결함 수정 ※시스템 인도 후 요구사항 변경 및 기능의 변화는 포함하지 않음 • 유상 유지보수 – 하자 보증기간이 만료된 이후의 모든 유지보수 행위 – 천재지변이나 운영자의 부주의 등의 무상유지보수 이외의 유지보수 – 유상 유지보수는 별도 계약에 의해 지원	• 제안범위에 속한 응용소프트웨어 및 하드웨어 등 모든 기자재 – 응용소프트웨어 – 하드웨어(서버 등) – 소프트웨어 – 네트워크

5. 하자보수

5-2. 하자보수 범위 및 내용

제안사는 본 사업의 안정적인 하자보수를 위하여 응용 프로그램, 하드웨어, 시스템 소프트웨어 기술지원을 제공함으로써 신속한 문제해결과 복구, 원인파악 및 동일/유사 문제 발생소지 해소 등을 지원하여 원활한 시스템 운영을 보장합니다.

하자보수 범위 및 내용

구 분		비율
하자보수 대상		• 본 사업에서 개발/납품/설치되는 모든 응용프로그램과 하드웨어/ 소프트웨어, 기자재
하자보수 기간		• 개발된 시스템의 무상유지보수 기간은 현지검수 완료일로부터 24개월 • 납품된 기자재는 현지검수 완료 후 24개월 (일부 하드웨어는 3년간)
하자 보수 내용	하자보수	• 발견된 하자의 원인을 찾아 문제해결을 하는 경우로써 무상 보증기간에는 무상지원하며, 무상 보증기간 경과 후에는 유상지원함 • 하자 발생 시 문제의 유형을 파악 후 즉시 조치하고, 조치된 내용을 응용시스템 운영자에게 교육
	기능개선	• 새로운 기능을 추가하고 기존의 시스템을 개선하는 경우로써 유상제공을 원칙으로 하며, 상세사항은 추후 협의함
	환경적응	• 신규 운영체제, 혹은 신규 하드웨어 환경으로 이식하는 경우 유상으로 지원
	장애복구	• 시스템 운영 중 발생한 고장 및 장애 복구 기술지원 • 즉각적인 원인분석 및 복구 보장 • **현지 파트너쉽 기업을 통한 장애 대응 지원**
	예방점검	• 유지보수의 용이성을 높이거나 시스템의 신뢰성을 향상시키는 경우로써 무상 지원 • 예방점검과 이상 징후 발생 시 수시 예방정비 실시 • **현지 파트너쉽 기업을 통한 일정기간(협의 필요) 동안 정기점검 수행**
하자 보수 대상	무상 하자보수	• 시스템 제안내역과 공급시스템이 상이하거나 하자가 있는 경우 무상 하자보수 지원
	유상 유지보수	• 무상 보증기간이 만료된 이후의 모든 유지보수 행위 • 유상 유지보수는 별도 계약에 의해 지원
	기타	• 원활한 하자보수 지원을 위한 비상연락체계 유지 • 제공한 솔루션이 요구조건을 충족할 수 없을 때 요구조건 충족 가능한 제품으로 무상교체 • 유상유지보수는 무상하자보수 완료 후 주관기관과 계약을 체결하여 실시 • 무상하자보수 기간 중이라 하더라도 현재 시스템의 기능 외에 새로운 기능, 요구사항의 발생 등 추가 요구사항에 대해서는 주관기관과 협의하여 결정 • 고객의 고의 또는 천재지변에 의한 장애에 대해서는 책임을 지지 아니함 • 유지보수 인력 이외의 인력이 수행한 시스템 개조, 첨가, 조정 및 수리로 시스템에 중대한 영향을 끼친 경우는 유상 처리함

※ 하자보수 조직과 절차는 유지관리 조직 및 절차와 동일하게 수행 함

6. 기밀보안

제안사는 사업 수행 시 물리적, 관리적, 기술적 측면에서 효과적인 보안대책을 마련하고, 주관기관 및 제안사의 보안수칙을 준수합니다. 제안 시 정보보안 지원조직의 보안착수지원 및 보안교육과 함께 프로젝트 보안관리자를 선정하여 과업수행 및 **사업이 완료된 후에도 철저한 기밀보안**을 실시합니다.

기밀보안 체계

프로젝트 관리자	보안 관리자	프로젝트 팀원
• 프로젝트 보안 책임자 선정 • 프로젝트 보안에 대한 최종 책임 • 프로젝트 보안체계의 설정 및 지속적 점검	• 각종 비문의 보안성 검토관리 • 각종 보안상태 점검 및 확인 감독 • 보안 서약서 관리 및 보안조치 • 문서, 시설, 통신 등 보안관리	• 보안관리규정 준수 • 보안 책임자의 지시에 따라 보안업무 수행 • 보안의식 함양

기밀보안 상세대책

보안책임자 운용	• 보안책임자 정/부 임명 • 보안임무 수행에 필요한 교육을 이수하여 임무 수행
저작권 존중	• 본 사업의 계약목적물의 저작권은 조달청과 제안 컨소시엄의 공동소유를 원칙으로 하나 특수성을 고려, 협의하여 정함 • 본 사업에 사용되는 오픈소스 소프트웨어에 대해서는 라이선스 정책 및 사용여부 명시
개인정보보호 보안	• 기관 사용자의 특성을 고려하되 업무권한에 대한 명확한 관리를 통하여 불필요한 정보에 대한 접근을 원천적으로 차단 • 전문업체를 통한 '개인정보영향평가'와 정보보호 컨설팅을 수행하여 구체적이고 실질적인 개인정보 영향평가서 제출
인원보안	• 프로젝트 투입인원은 보안서약서 작성 및 출입증 패용 • 방문객은 방문객 출입대장에 기록 후 보안책임자의 승인 받음 • 방문객의 방문시간은 정상근무시간/지정된 장소에서만 허용 (보안책임자의 승인 시 예외)
문서보안	• 비밀/대외비 문서는 본인에게 직접 전달하는 것을 원칙으로 함 • 비밀/대외비 문서를 FAX/전자우편/우편 등을 이용할 시 보안 책임자의 사전 승인 취득 • 작성프로그램 소스 코드 및 관련 S/W의 유출 방지를 위해 디스크, CD,출력물 별도 관리
통신보안	• 전화/FAX/인터넷 사용은 보안책임자의 통제하에 사용 • 본 사업 추진내역에 대해서는 인터넷 등의 접근을 통제하고 보안책임자의 승인하에 열람
시설보안	• 본 사업 개발을 위해 사용되는 서버/네트워크 장비는 보안이 잘 유지되는 장소에 보관 • 장비의 위치, 네트워크 구성요소/접속장치, H/W, S/W의 등록사항을 기록 및 관리 • 장비가 위치한 장소에 대한 비 인가자의 출입 통제 및 보안일지 작성

가. 백업 방안

장애발생시 즉각적 대처를 통해 피해 최소화와 업무연속성 보장을 위해 백업관리 대상 선정 및 발생 가능한 장애상황을 가정하여 복구절차를 체계화하고, 주기적인 복구테스트를 실시하여 신속한 복구가 가능하도록 관리체제를 유지합니다.

백업방안에 따른 백업절차 및 정책 수립

백업관리방안

방안구분	방안내용
스케줄 관리	백업장치를 이용한 주기적인 백업은 이미 등록된 스케줄에 의해서 자동 백업 툴을 이용하여 처리 백업 스케줄 사항의 변경이나 스케줄에 등록된 사항 외의 백업 등 특수한 상황이 발생 한 경우에 한해서 스케줄 변경 관리 수행 (비정기 백업 관리)
보관 주기 관리	백업 대상의 데이터양은 주기적으로 또는 상황에 따라 변동될 수 있기 때문에 초기에 설정된 현황을 분석하여 백업주기를 조정
상태 관리	백업작업의 실행 상태 및 백업 툴의 백업로그를 점검하여 백업 상태 확인

백업절차



백업정책

구분	백업대상	백업주기	보관주기
O/S	• 매월 Root disk, OS 커널 등 서버의 주요 변경사항 • ignite, mksysb	• 월 1회 • Patch 또는 기타 변경 시	• 3개월
데이터 베이스	• 데이터베이스의 파라미터 파일, 컨트롤 파일, 데이터 파일 • Archive Log • LIBRARY 백업을 기본으로 한 online 백업	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 매일부터 1주	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 1주부터 1개월
응용 프로그램	• 응용 어플리케이션 • LIBRARY 백업	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 매일부터 2주	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 1주부터 1개월
개발 산출물	• 형상 관리 서버, 배포 서버	• 주 1회 (FULL) / 매일 (INC)	• 1 개월
상용 S/W	• 상용 S/W • LIBRARY 백업	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 매일부터 1주	• 업무 특성 및 백업대상에 따라 1주부터 1개월

나. 복구 방안

예기치 않은 시스템의 장애에 대비하여 시스템 및 데이터 백업정책(일일, 주간, 월간)을 수립하여 관리하며, 재해발생 시 운영자는 보안관제센터와의 협업을 통해 데이터 백업 자료를 이용한 신속한 복구를 통해 안정적이고 지속적인 운영서비스를 지원합니다


신속한 데이터 및 시스템 복구 방안

백업관리방안

구분	비고
복구절차관리	• 장애가 발생하여 적용했던 복구 절차나 발생 가능한 장애에 대비한 복구 절차 등에 대해 주기적인 테스트 활동 및 모의훈련을 통해 최적의 복구 절차를 수립하여 관리
복구상태관리	• 복구 완료 후에 데이터베이스의 정상 작동 여부, 복구된 데이터의 행 수 등을 확인하여 보고 및 이력관리 체제 구축
상태 관리	백업작업의 실행 상태 및 백업 툴의 백업로그를 점검하여 백업 상태 확인


데이터 복구방안

DR을 통한 복구 훈련




• 평상시 정기적 백업자료를 확보하여 비상상황 발생시 신속한 복구 지원함

데이터 복구 절차

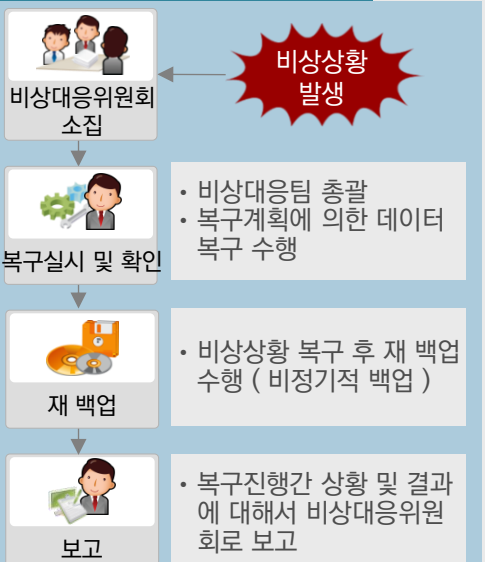

시스템 복구방안

• 비상 상황 후 시스템 복구 시, 장비시스템과 응용 SW 및 개발 프로그램 운영을 위한 환경 제공 후, 운영자는 백업된 데이터들을 기반으로 시스템의 복구를 수행함

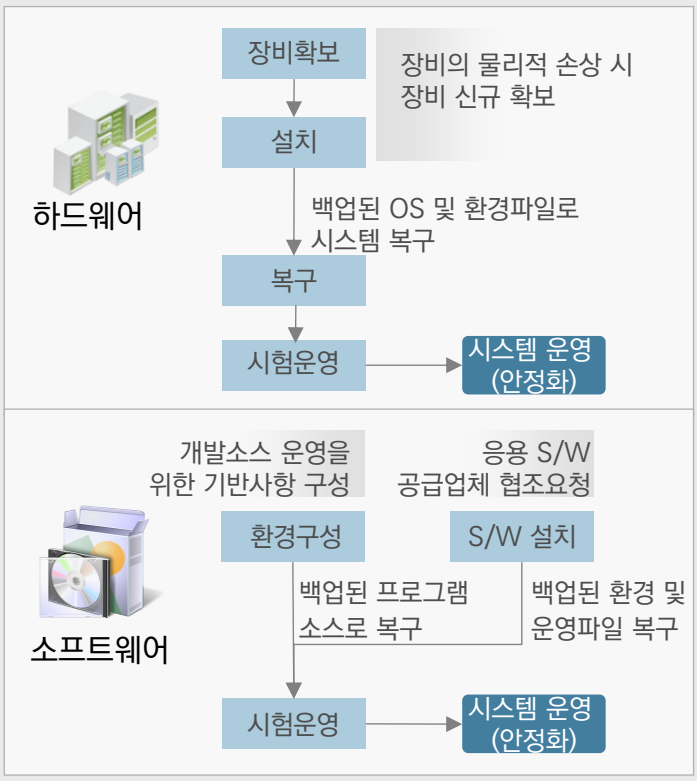

7. 비상대책

7-2. 장애대처 방안

제안사는 위험요소 식별 및 관리를 위한 기준으로써 위험요소 관리 Matrix와 영향도 평가지침을 활용하여 위험에 대해 신속하고 적정하게 대응합니다.

위험요소 관리 기준

위험요소 관리 Matrix

※ 비고: 영향도의 산정은 위험영향도 평가 테이블을 기준으로 함

상	중	상	상
중	하	중	상
하	하	하	중
발생 확률 / 위험 영향도	**하**	**중**	**상**

위험중요도	설명
상	프로젝트 완료에 영향을 미칠 수 있는 위험으로, 전담인력 배치 및 주기적인 관리가 필요함.
중	완화되지 않았을 때 프로젝트 일정, 비용, 품질에 영향을 주는 위험으로 위험 관리 담당자의 주기적인 모니터링이 필요함.
하	발생 가능성과 영향도 모두 '중' 이하인 경우로 추후 High Risk가 되지 않도록 관리해야 함.

위험요소 관리 Matrix

영향도		위험 영향도가 커짐		
		하	중	상
관리 분야	일 정	1주~2주	2주 이상	-
	설명	팀 내에서 해결이 가능한 이슈	일정 및 인력 재배치에 영향 팀 간의 조정절차를 거쳐야 해결이 가능한 이슈	PM의 의사결정이 필요한 사안으로 일정 지연, 변경이 불가피하여 추가비용 발생이 예상
